



Valtioneuvoston yhteisen verkkojulkaisuratkaisuhankkeen asettaminen

1 Asettaminen

Valtiovarainministeriö on asettanut hankkeen ja sille ohjausryhmän valtioneuvoston yhteisen verkkojulkaisuratkaisun toteuttamiseksi.

2 Toimikausi

Hankkeen toimikausi 28.1.2013-31.3.2014.

3 Tausta

Valtioneuvoston viestintäjohtajat lähestyivät syksyllä 2008 valtiovarainministeriötä kirjeellä, jossa toivottiin hallinnon kehittämisosaston käynnistävän hankkeen yhteisen julkaisujärjestelmän hankkimiseksi. Valtiovarainministeriö teetti talvella 2008-2009 pienimuotoisen selvityksen verkkojulkaisemisen silloisesta nykytilanteesta.

Vuoden 2010 keväällä valtiovarainministeriön ValtIT-yksiköstä lähetettiin muistio eri ministeriöihin keskustelunavaukseksi valtion yhteisestä verkkojulkaisujärjestelmästä, joka muodostaisi yhteisen ekosysteemin. Muistioon saadut kommentit heijastelevat, että yhteinen julkaisujärjestelmä koettiin tarpeelliseksi.

Valtiovarainministeriö teetti keväällä 2011 selvityksen, jonka tarkoituksena oli hakea jäseneltyjä vaihtoehtoja valtiohallinnon yhteisen julkaisujärjestelmän toteuttamiseksi sekä antamaan suositus toimintamallista ja etenemistavasta. Syksyllä 2011 käynnistettiin yhteisen julkaisujärjestelmän esiselvitysprojekti, jonka aikana tarkennettiin toiminnallisia tavoitteita ja toimintamallia.

4 Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on ohjata valtioneuvoston yhteisen verkkojulkaisuratkaisun toteuttamista. Ratkaisu tarjotaan asiakkaille kokonaispalveluna ja



se perustuu aluehallinnon tietohallintopalveluyksikkö AHTi:n tuottamaan verkkojulkaisuratkaisuun. Yhteisen ratkaisun tavoitteena on yhdenmukaistaa valtioneuvoston verkkoviestinnän teknistä toteuttamista sekä vähentää merkittävästi verkkojulkaisuratkaisujen kilpailutukseen ja kehittämiseen valtionhallinnossa käytettyä päällekkäistä työpanosta.

Tavoitteena on myös saada kokemuksia ketteristä kehittämismenetelmistä yhteisten ratkaisujen kehittämisessä ja yhteisten ratkaisujen hallinnasta avoimen tuotteenhallintamallin pohjalta. Hankkeen taloudellisena tavoitteena on saavuttaa käytössä olevilla resursseilla laajempi vaikuttavuus ja nykyistä korkeampi varautumisen taso tarjoamalla keskitetysti hallittu, yhdenmukainen ja käytön tarpeen mukaan skaalautuva tekninen alusta ja palvelujen tuotantomalli.

Hankkeen tavoitteiden alustavat mittarit on kuvattu hankesuunnitelmassa.

5 Tehtävä

Hankkeen tehtävänä on ohjata valtioneuvoston yhteisen verkkojulkaisuratkaisun toteuttamista sekä koordinoida sen käyttöönottoa ja jatkokehittämistä niin, että se tukee valtioneuvoston verkkoviestinnän yhteisen kokonaisratkaisun toteuttamista. Yhteisen ratkaisun toiminnalliset vaatimukset määritellään valtioneuvoston kanslian johtamassa valtioneuvoston verkkoviestinnän uudistushankkeessa.

Verkkopalveluratkaisun kehittäjänä ja toimivan verkkopalvelun tuottajana toimii aluehallinnon tietohallintopalveluyksikkö (AHTi). AHTi:n tuottamalla verkkopalvelualustalla tuotetaan AHTi:n asiakkaiden verkkopalveluita. Valtioneuvoston verkkopalvelut toteutetaan samaa alustaa hyödyntäen.

Hankkeen tehtävänä on kehittää toimivaksi ja saattaa käytäntöön hankesuunnitelmassa hahmoteltu verkkojulkaisuratkaisun rahoitus-, hallinta- ja ohjausmalli, jossa on määritelty eri osapuolten roolit, vastuut ja velvollisuudet.

6 Hankkeen rajaukset ja liittymät

Valtioneuvoston verkkoviestinnän kehittämistä ohjaa valtioneuvoston kanslian asettama valtioneuvoston verkkoviestinnän uudistushanke.

Teknisen ratkaisun palvelukokonaisuuden suunnittelussa ja toteutuksessa pilottiorganisaatioina ovat valtiovarainministeriö, valtioneuvoston kanslia, sosiaali- ja terveysministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö, joiden verkkopalvelu-uudistukset toteutetaan tässä hankkeessa tuotettavalla ratkaisulla. Pilottiorganisaatioiden verkkopalveluiden sisällöntuotanto tai -siirto vanhoista palveluista ei kuulu tämän hankkeen tehtäviin. Hanke ei vastaa organisaatioiden verkkosivustojen käyttöönotoista, mutta verkkojulkaisupalvelua tuottava palvelukeskus voi tarjota käyttöönottoihin liittyviä palveluita osana käyttöönottoprojekteja.

Hankkeessa seurataan ja tehdään mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä Kuntien Tiera Oy:n kuntien verkkosivusto -projektin kanssa sekä muiden julkishallinnon verkkojulkaisuratkaisujen kehittämisprojektien kanssa.

7 Kohderyhmät, sidosryhmät ja hyödynsaajat

Hankkeen lopputuloksena syntyvän palvelukokonaisuuden merkittävin kohderyhmä on kansalaiset. Yhteinen ratkaisu edistää kansalaisten tiedonsaantia valtioneuvoston ja valtionhallinnon toiminnasta sekä demokratian toteutumista.

Muita merkittäviä kohderyhmiä ovat ministeriöt, valtionhallinnon virastot ja näiden verkkoviestintäkanavien asiakkaat: muu julkinen hallinto ja viranomaiset, media, järjestöt ja yritykset.

Hankkeen sidosryhmäverkosto on laaja: kansalaiset, valtioneuvoston viestinnän ja verkkoviestinnän toteuttajat, valtionhallinnon virastojen viestinnän toteuttajat, valtionhallinnon IT-palvelukeskukset.

8 Hankkeen riskit

Merkittävimmät riskit liittyvät hankkeen laajuuteen ja tavoitteen hallintaan. Hankkeen riskeiksi on tunnistettu mm.

- yhteisen ratkaisun päätöksentekoprosessi, päätöksentekoon liittyvät vastuut sekä ohjaus-, rahoitus- ja hallintamalli
- organisaatioiden sitoutumattomuus yhteiseen palvelukokonaisuuteen ja sen käyttöönottamisen edellyttämään toimintatapojen muutokseen
- liian tiukka aikataulu ja tästä johtuva hankkeen aikataulun venyminen
- toimintamallin vaatima resurssien sitoutuminen ja resurssien riittävyys
- joustavuuden ja ketteryuden säilyttäminen palvelukokonaisuuden kehittämisessä ja ylläpidon linjaamisessa.
- palvelun toteuttajan resurssit

Hankkeen riskejä minimoidaan toteuttamalla hanke mahdollisimman avoimesti ja mahdollistamalla eri osapuolien osallistuminen hankkeen eri vaiheissa sekä suunnittelemalla aikataulu ja resursointi tasapainoon lopputulosten kanssa.

9 Organisointi

Strateginen johtoryhmä

Valtiovarainministeriön ohjausryhmän ja valtioneuvoston kanslian valtioneuvoston verkkoviestinnän uudistamishankkeen ohjausryhmän työtä yhteen sovittaa hankkeiden yhteinen strateginen johtoryhmä. Sen tehtävänä on seurata ja ohjata valtioneuvoston kanslian ja valtiovarainministeriön hankkeiden etenemistä.

Johtoryhmän kokoonpano:

Olli-Pekka Heinonen (pj.), valtiosihteeri, valtioneuvoston kanslia

Kari Mokko, osastopäällikkö, valtioneuvoston kanslia

Timo Valli, ICT-johtaja, valtiovarainministeriö

Esko Vainio, erityisasiantuntija, yksikönpäällikkö, valtiovarainministeriö

Päivi Paasikoski (sihteeri), viestintäpäällikkö, valtioneuvoston kanslia

Ohjausryhmä

Yhteisen verkkojulkaisuratkaisun toteutushankkeen omistajana toimii valtiovarainministeriö. Valtiovarainministeriö asettaa ohjausryhmän, johon pyydetään osallistujat pilottina toimivista ministeriöistä.

Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata hanketta strategisella tasolla niin, että lopputulos täyttää toiminnalliset tarpeet ja noudattaa sovittuja linjauksia ja tavoitteita. Ohjausryhmän tehtävänä ei ole vastata IT-toimittajien ohjauksesta, hankintapäätöksistä tai palvelukeskuksen tekemistä sopimuksista ulkopuolisten toimittajien kanssa.

Ohjausryhmän kokoonpano:


Esko Vainio (pj.) erityisasiantuntija, yksikönpäällikkö, valtiovarainministeriö

N N, jäsen

N N, jäsen

Projektiryhmä

Yhteisen verkkojulkaisuratkaisun toteutushankkeen projektiryhmän muodostavat ainakin pilottiorganisaatioiden verkkopalveluprojektien projektipäälliköt ja palvelukeskuksen projektipäällikkö. Projektiryhmän tehtävänä on yhteen sovittaa yhteisen konseptin ja verkkojulkaisuratkaisun toiminnallisuuksien toteutus sekä valmistella esitykset ohjausryhmän päätettäväksi.

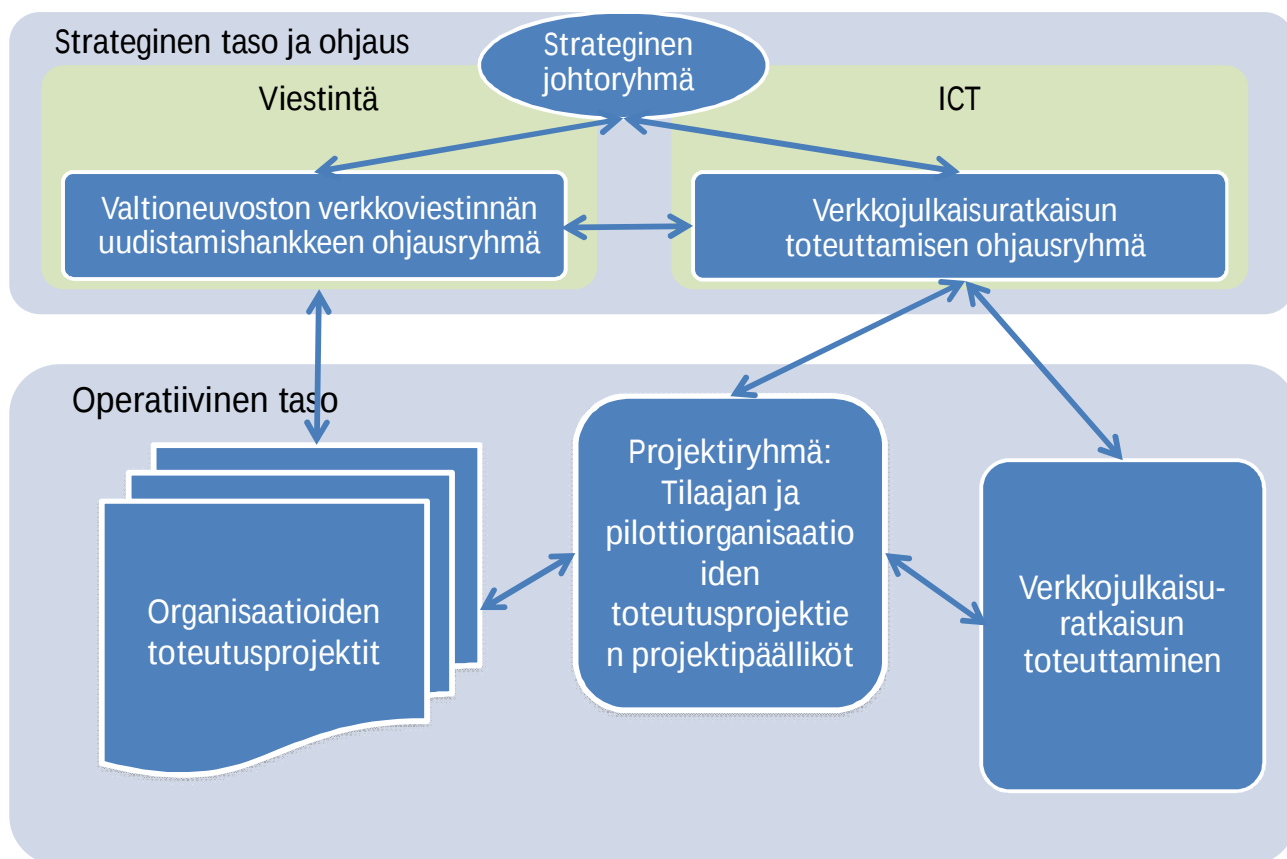

Referenssiryhmä

Referenssiryhmään voivat osallistua ne ministeriöt ja hallinnonalojen organisaatiot, jotka eivät ole yhteisen ratkaisun pilotteina. Ryhmän tehtävänä on välittää tietoa eri toimijoiden välillä. Referenssiryhmää ei aseta erikseen.

10 Kustannukset ja rahoitus

Ohjausryhmä ja projektiryhmä työskentelevät virkatyönä. Ryhmien jäsenille ei makseta palkkiota. Kukaan organisaatio vastaa edustajiensa matkakustannuksista.

Yhteistä verkkajulkaisuratkaisua käyttävät organisaatiot vastaavat yhteisen ratkaisun, omien verkkopalveluidensa ja näiden tarvitsemien lisätoiminnallisuuksien kehittämisen ja käyttämisen kustannuksista palvelukeskuksen hinnaston mukaisesti. Jokainen tilaajaorganisaatio tekee oman toimitussopimuksen palvelutuottajan kanssa. Jokainen yhteistä ratkaisua käyttävä organisaatio vastaa palvelutuotannon kustannuksista palvelukeskuksen hinnaston mukaisesti toimitussopimuksessa esitetyn kustannusarvion ja sopimusehtojen puitteissa.

ICT-johtaja

Timo Valli

Eriyisiasiantuntija,
yksikönpäällikkö

Esko Vainio

Liitteet

Hankesuunnitelma – valtioneuvoston yhteinen julkaisujärjestelmä (luonnos)

JAKELU

Ministeriöt
Valtiokonttori
Kansaneläkelaitos
Maanmittauslaitos
Verohallitus
Väestörekisterikeskus
Aluehallinnon tietohallintopalveluyksikkö AHTi

TIEDOKSI

Valtioneuvoston hankerekisteri
