



VALTIONEUVOSTO  
STATSRÅDET

# Maakunnan järjestämistehtävässä tarvitsemat digipalvelut

Ohjausryhmä 9.4.2018

5.4.2018

Tuija Kuusisto





# Sisältö


- Projektin tausta ja tavoitteet
- Työsuunnitelma
- Toimenpiteet ja tuotokset 5.4. mennessä
- Seuraavat tehtävät
- Huomiot, riskit ja huolenaiheet

# Projektin tausta ja tavoitteet

- Maakunnan digipalvelut järjestämistehtävässä –esisuunnittelu-hankkeen tehtävänä on edesauttaa järjestämistehtäviä tukevien mallien ja työkalujen käyttöönottoa.
- Esisuunnitteluhankkeen tavoitteena on selvittää:
  - Mitä nykyisiä ratkaisuja voidaan/kannattaa hyödyntää maakuntien järjestämistehtävässä?
  - Mitä uusia ratkaisuja tullaan kehittämään keskitetysti ja minkälainen siirtymävaihe uudistamiseen tarvitaan?
  - Mitkä ovat merkittävimmät järjestelmät, joiden kehittämisestä maakunnat vastaavat itsenäisesti?
  - Mitä tietovarantoja sekä keskeisiä tietoja järjestämistehtävän digipalveluissa tullaan hyödyntämään, jotta yhteensopivuus varmistetaan?

# Järjestäjän työkalut – eteneminen

-  Kaikkien maakuntien työpaja
-  Valmistelutyöpaja (Uusimaa, Keski-Suomi)

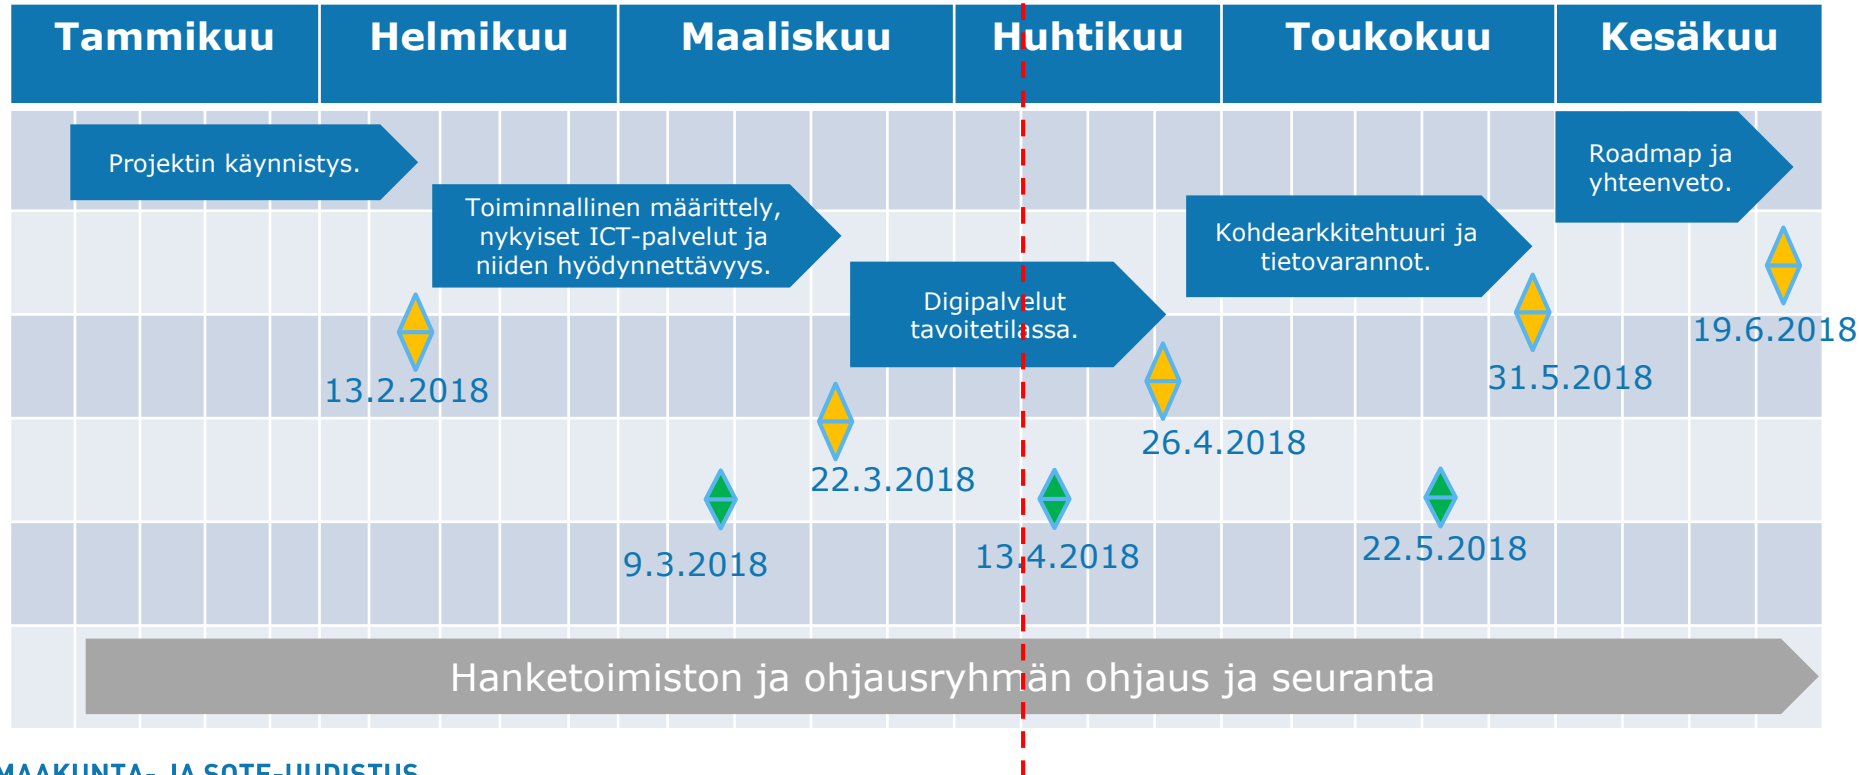

# Toimenpiteet ja tuotokset 5.4. mennessä

- Työpajat
  - **13.2. Kickoff** työpaja:
    - Yhteinen kaikille neljälle järjestämisen digipalvelujen ja tiedolla johtamisen suunnitteluhankkeille
    - Noin 70 osallistujaa
  - **22.3. Toiminnallisuuden ja järjestelmien alustava selvitystyö**
    - Keski-Suomi valmisteli työpajaan maakuntien viitearkkitehtuuriin ja kyvykkyyssuunnitteluun perustuvan lähestymistavan Järjestäjän toimintaprosessien ja niitä tukevien tietojärjestelmäpalveluiden selvittämiseksi Järjestäjän käsikirjan pohjalta
    - Uusimaa esitteli järjestämistehtävään liittyviä nykyisiä tietojärjestelmiä
    - Muille maakunnille annettiin välitehtävät, 6.4. mennessä, em. aineistojen täydentämiseksi.
    - Saadun palautteen perusteella Keski-Suomi ja Uusimaa valmistelevat esitykset seuraavaan työpajaan.
    - Noin 45 osallistujaa.
- Keski-Suomi ja Uusimaa vastanneet valmistelutyöstä työpajojen välissä

# Seuraavat toimenpiteet

- Keski-Suomi ja Uusimaa tekevät synteessin Järjestäjän toiminnallisuuksista ja nykyisistä tietojärjestelmistä ja niiden hyödynnettävyydestä välitehtävien perusteella.
  - Esittely työpajassa 26.4.
- Keski-Suomi ja Uusimaa laativat kohdekuvaukset yhdessä viitearkkitehtuuryöryhmän kanssa
- Tavoitteena on liittää järjestäjän tehtäviin liittyvät prosessit, niitä tukevat tietojärjestelmäpalvelut ja tietojärjestelmät sekä tietovarannot.
  - Esittely työpajassa 31.5.
- Keski-Suomi ja Uusimaa laativat analyysin tarvittavista uusista tietojärjestelmistä/digipalveluista
  - Tuloksena kehittämisen tiekartan alustava ensimmäinen versio
  - Esittely päätöstyöpajassa 19.6.

# QPR: Huomiota, riskejä ja huolenaiheita

- Huomio: Löydetty yhteistyötapa tämän hankkeen ja Maakuntien viitearkkitehtuuri (MVA)-työryhmän sekä ”järjestäjän käsikirjan” välille.
  - Yhteistyötä tiivistettävä edelleen.
- Riski: Pällekkäiset työt eri hankkeiden - erityisesti tiedon ja toiminnallisuuden välillä, jolloin päällekkäisyydet voivat aiheuttaa ristiriitaisia tai siilomaisia kuvauksia, jotka eivät integroidu keskenään.
- Riski: Monet maakunnat eivät kykene osallistumaan riittävästi tähän työhön vaan vastuu tuotoksista jää liikaa Keski-Suomen ja Uudenmaan vastuulle
- Huolenaihe: Projektissa tarvitaan enemmän maakuntia velvoittavaa ohjaamista. Vapaaehtoisuuden pohjalta ei synny riittävän nopeasti asioita.
- Huolenaihe: Keskitytään liikaa tietojärjestelmien ja -palveluiden nykytilaan eikä panosteta tavoitetilan suunnitteluun. Nykytilaa tulisi tarkastella siirtymäajan tarpeiden ja tavoitetilan tavoitteiden näkökulmasta.

# Ehdotus: Riskien ja huolien minimoimiseksi

| Riski/ huolenaihe  | Toimenpide  |
|--|---|
| Päällekkäiset työt eri hankkeiden - erityisesti tiedon ja toiminnallisuuden välillä, jolloin päällekkäisyydet voivat aiheuttaa ristiriitaisia tai siilomaisia kuvauksia, jotka eivät integroidu keskenään. | VM ja QPR tukevat Yhteistyöpajoja ja ristiin osallistumisia sekä maakuntien kokonaisarkkitehtuuriryhmän että sote-tiedolla johtamisen suunnitteluhankkeiden kanssa. Yhteinen säännöllinen koordinaatiokokous sote-tiedolla johtamisen suunnitteluhankkeiden kanssa. |
| Monet maakunnat eivät kykene osallistumaan riittävästi tähän työhön vaan vastuu tuotoksista jää liikaa Keski-Suomen ja Uudenmaan vastuulle   | VM on pyytänyt kaikkia maakuntia nimeämään työhön yhteyshenkilön 13.4. mennessä.  |
| Projektissa tarvitaan enemmän maakuntia velvoittavaa ohjaamista. Vapaaehtoisuuden pohjalta ei synny riittävän nopeasti asioita.  | VM ja QPR innostavat maakuntien yhteyshenkilöiden kautta maakuntia osallistumaan enemmän yhteistyöhön. VM ja maakunnat ottavat Oma maakunta maakuntakierroksen Järjestämisen työpajassa yhtenä näkökulmana esille digipalvelut.                                     |
| Keskitytään liikaa tietojärjestelmien ja -palveluiden nykytilaan eikä panosteta tavoitetilan suunnitteluun. Nykytilaa tulisi tarkastella siirtymäajan tarpeiden ja tavoitetilan tavoitteiden näkökulmasta. | VM ja QPR hakevat järjestämisen tehtävien tavoitetilan kautta painopistettä digipalvelujen tavoitetilan kuvaamiseen. QPR ja Vimana keskittyvät tavoitetilan kuvaamisen tukemiseen.  |





VALTIONEUVOSTO  
STATSRÅDET

# Kiitos!

**Tuija Kuusisto**

**Tuija.kuusisto@vm.fi**
