




VALTIONEUVOSTO
STATSRÅDET

SOTE-tiedolla johtamisen suunnitteluhankkeet


Mikko Huovila
STM OHO DITI




SOTE-rakenteen ohjauksen ja johtamisen tietopohja

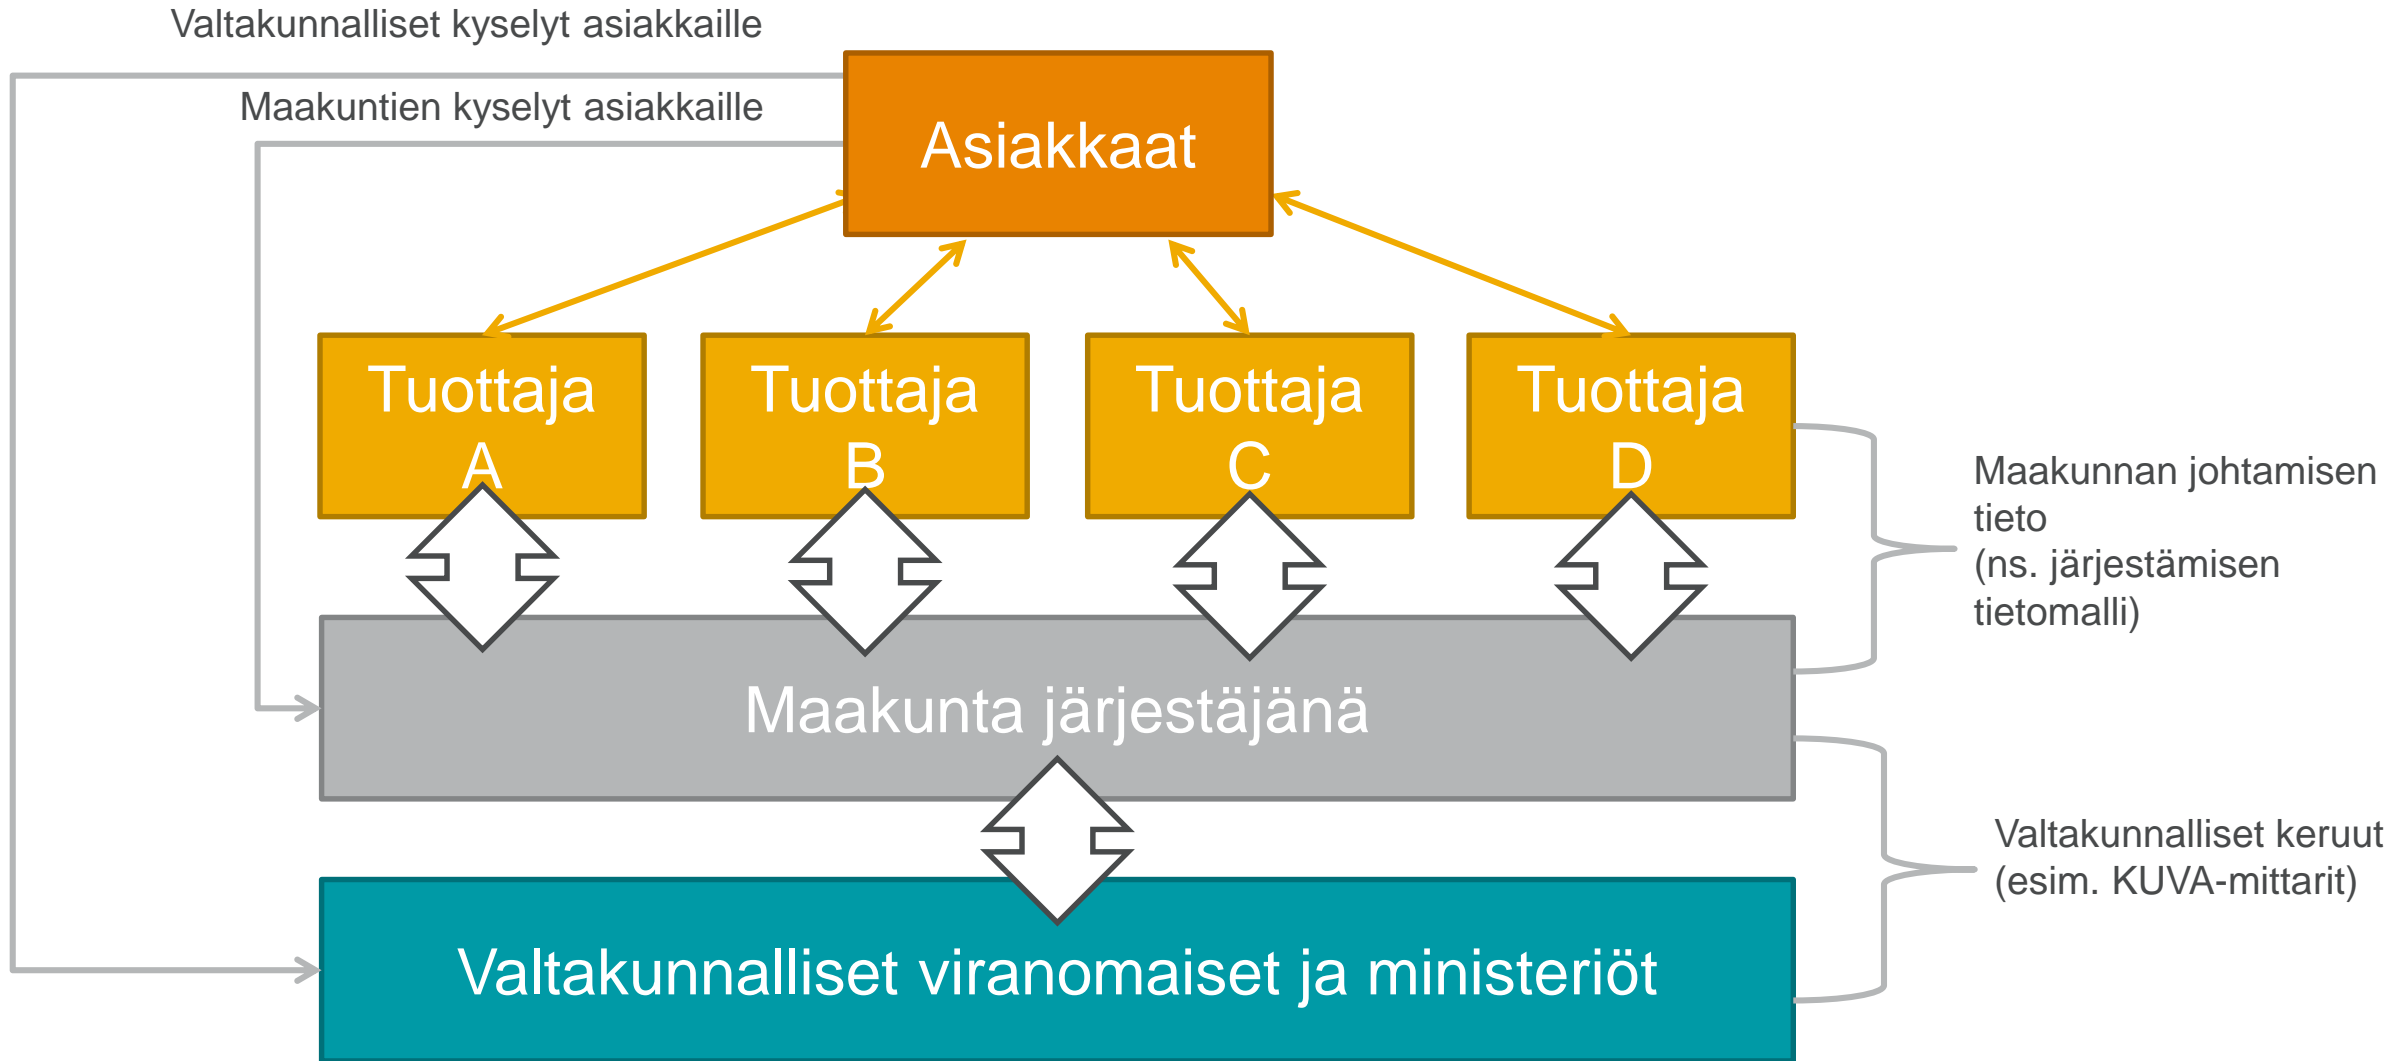

Järjestäjän tietojohdamiseen vaikuttavia tekijöitä



SOTE tiedolla johtamisen suunnitteluhankkeet

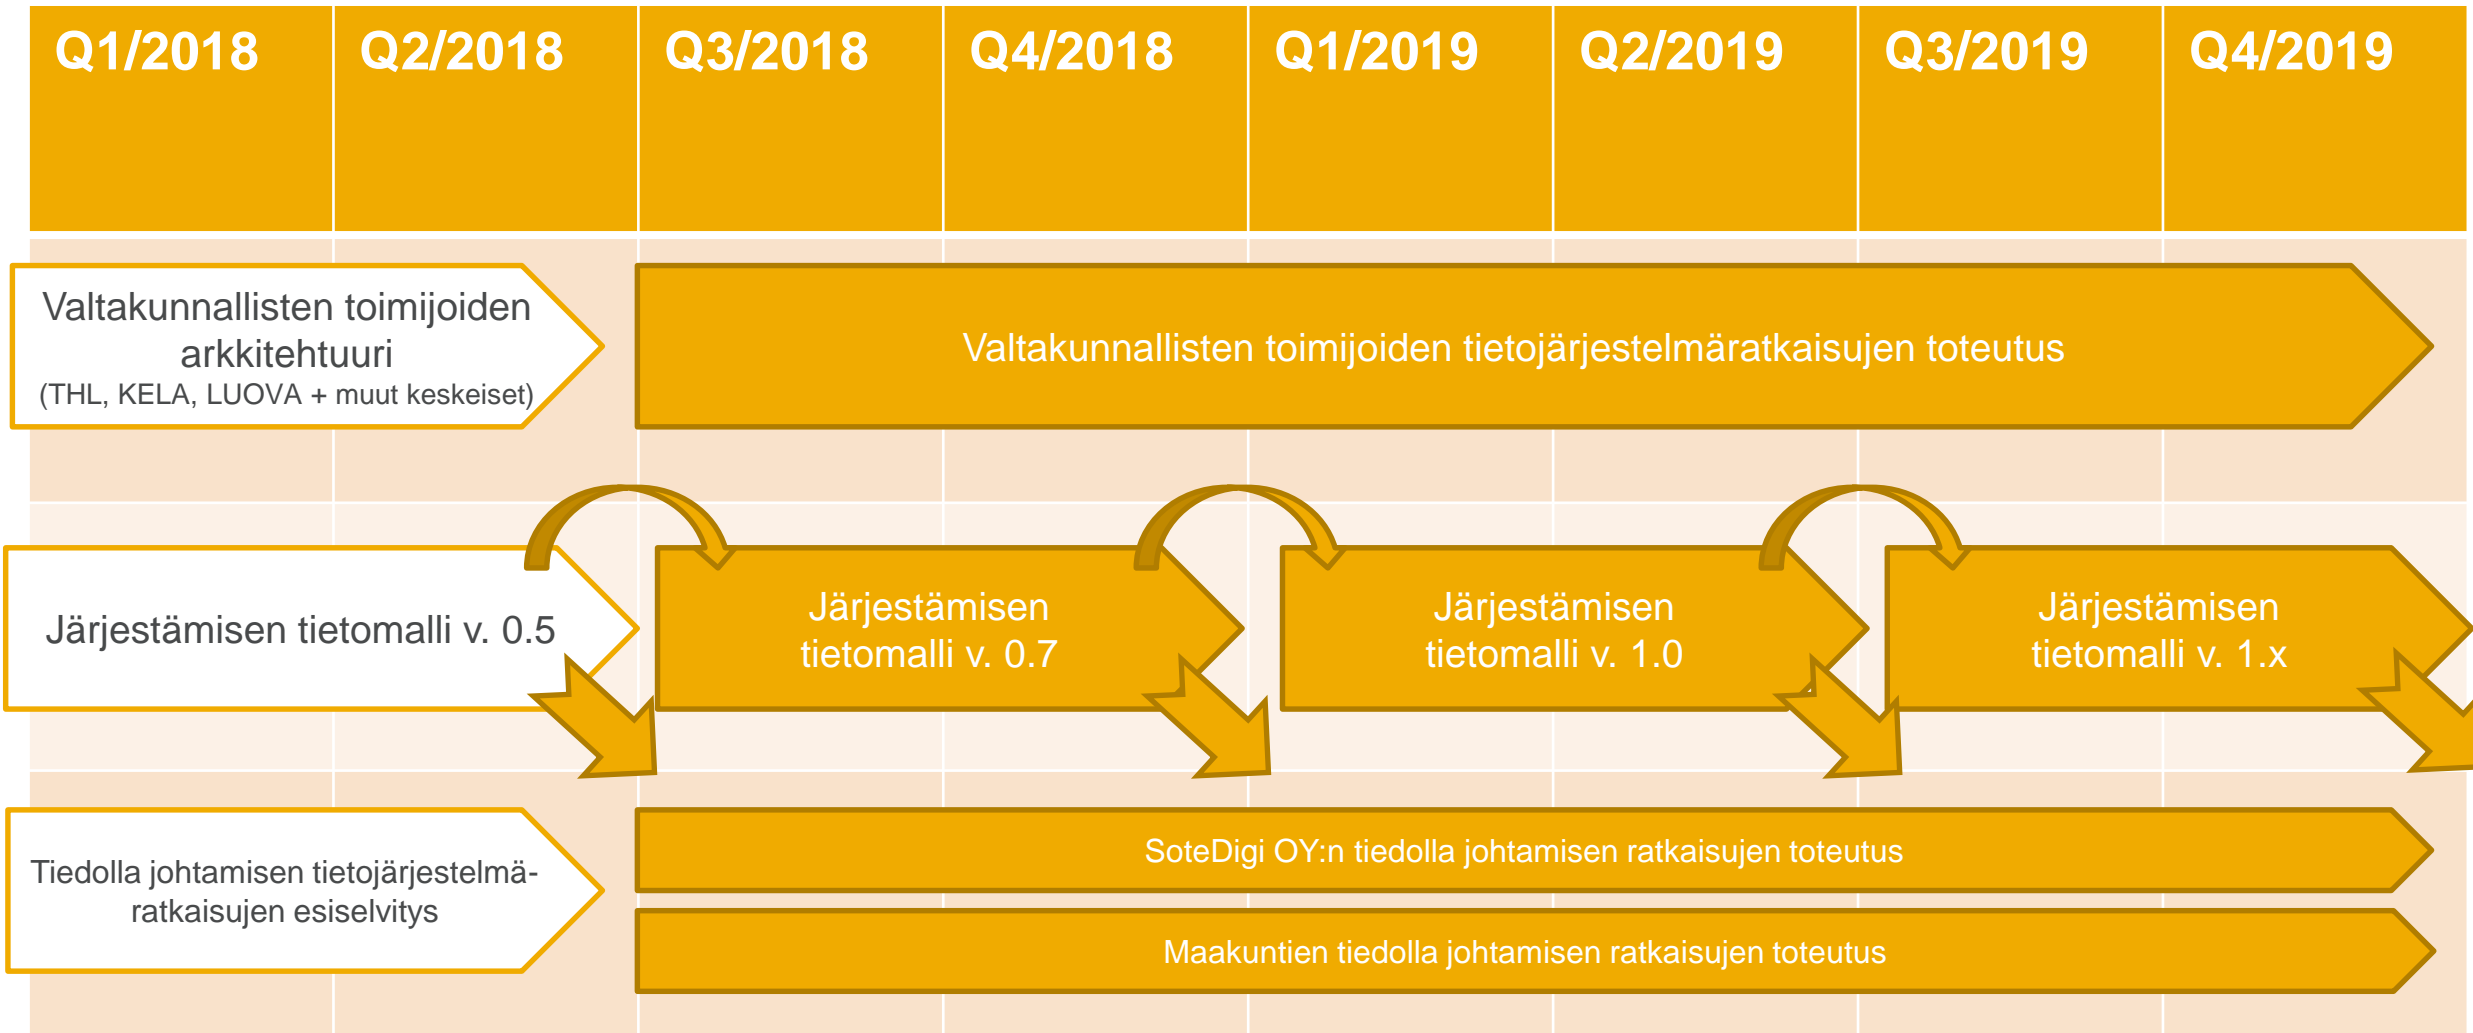

	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu
Digipalvelut järjestämistehtävissä (TORI)	13.2. Yhteinen kick off	22.3. Työpaja Digipalvelut tavoitetilassa	9.4. Ohjausryhmä 26.4. Ratkaisuarkkitehtuuri ja tietovarannot	31.5. Toteutuksen vaiheistus	15.6. ohjausryhmä
SOTE järjestämisen tietomalli	13.2. Yhteinen kick off 14.2. esittely SOTE muutosjohtajien etkoilla	23.3. Työpaja	9.4. Ohjausryhmä 19.4. Työpaja	15.5. Työpaja (tietomallin sisällön esittely) 31.5. Työpaja	15.6. ohjausryhmä 5.6. työpaja
SOTE tietojohdamisen välineet	13.2. Yhteinen kick off	?	9.4. Ohjausryhmä 19.4. Työpaja	?	15.6. ohjausryhmä
SOTE valtakunnalliset viranomaiset	13.2. Yhteinen kick off 28.2. Työpaja (Valtakunnalliset sote-toimijat)	26.3. Muut valtakunnalliset toimijat	9.4. Ohjausryhmä 19.4. Valtakunnallisten toimijoiden ja maakuntien	15.5. Työpaja loppuraportti	15.6. ohjausryhmä

Loppuseminaari?

Perustiedot

Tila	Käynnissä
Hankeen / Projektin nimi	DM 4.1.1 Valtakunnallisten toimijoiden TJ-arkkitehtuuri
Hanke- tai Projektipäällikkö	Huovila Mikko
Aloituspvm ja valmistuspvm	18.1.2018 -
Raportointijakso	5.4.2018
Riskit ?	0 riskiä

Liikennevalot ?

Edistyminen	40%
Aikataulu	Suunniteltu
Kustannukset	Suunniteltu
Tuotosten laatu	Suunniteltu
Tuotosten laajuus	Poikkeama, vaatii seurantaa
Henkilöstö	Suunniteltu
Riskit	Poikkeama, vaatii seurantaa
Hyödyt	Suunniteltu

Raportin liitteet ja linkit

Yleistilanne suhteessa hanke-/projektisuunnitelmaan

Projekti edennyt projektisuunnitelman mukaan kohtuullisen hyvin.

Keskeiset aikaansaannokset raportointikaudella

- työpaja muiden valtakunnallisten viranomaisten kanssa pidetty
- arkkitehtuurimalleja työstetty eteenpäin konsultin ja toimijoiden toimesta
- tehty hyvää yhteistyötä kokonaisuuden muiden projektien kanssa

Kumulatiivinen kokonaisseuranta (eur) ?

Kustannusjaottelu	Budjetti	Toteuma	Sidotut	Ennuste
Palvelujen ostot	0 €	0 €	0 €	0 €
Omat henkilöstökustannukset	0 €	0 €	0 €	0 €
Muut kustannukset	0 €	0 €	0 €	0 €
Välilliset kustannukset	0 €	0 €	0 €	0 €
Yhteensä	0 €	0 €	0 €	0 €

Poikkeamat, ongelmat tai riskit

- Projektin aikataulu suhteessa asian laajuuteen tiukka
- Vaatii priorisointia tehtävälle työlle, jotta päästään riittävään konkretiaan

Keskeiset tehtävät seuraavalla raportointikaudella

- Seuraavan työpajan pitäminen maakuntien kanssa
- Mallien tarkentaminen työskentelyn pohjalta
- Loppuraportin työstäminen

Kumulatiivinen kokonaisseuranta (htp) ?

Nimi	Budjetti	Toteuma	Ennuste
Yhteensä htp	0 htp	0 htp	0 htp

RAPORTTIHISTORIA

Raportointijakso	Edist.	Aik.	Kust.	Laatu	Laaj.	Henk.	Riski	Hyö.	Hanke- tai Projekti- päällikkö	Aloituspvm ja valmistuspvm	Kumul. kok.seuranta (eur)				Kumul. kok.seuranta (htp)		
											Budjetti	Toteuma	Sidotut	Ennuste	Budjetti	Toteuma	Ennuste
5.4.2018 Huovila Mikko									Huovila Mikko	18.1.2018	0 €	0 €	0 €	0 €	0 htp	0 htp	0 htp
2.3.2018 Huovila Mikko									Heinäsenaho Markku	18.1.2018	0 €	0 €	0 €	0 €	0 htp	0 htp	0 htp

Perustiedot

Tila	Käynnissä
Hankkeen / Projektin nimi	DM 4.1.2 Järjestämisen tietomalli
Hanke- tai Projektipäällikkö	Huovila Mikko
Aloituspvm ja valmistuspvm	18.1.2018 -
Raportointijakso	26.3.2018
Riskit ?	0 riskiä

Liikennevalot ?

Edistyminen	30%
Aikataulu	Suunniteltu
Kustannukset	Suunniteltu
Tuotosten laatu	Suunniteltu
Tuotosten laajuus	Suunniteltu
Henkilöstö	Suunniteltu
Riskit	Poikkeama, vaatii seurantaa
Hyödyt	Suunniteltu

Raportin liitteet ja linkit

Yleistilanne suhteessa hanke-/projektsuunnitelmaan

Projekti lähtenyt liikkeelle yhteisestä Kick-offista.

Pidetty ensimmäinen maakuntien yhteinen työpaja pidetty 23.3. Hanke etenee suunnitelman mukaan.

Keskeiset aikaansaannokset raportointikaudella

- Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Karjalan yhteistä suunnittelua on tehty mm. yhteisessä kehittämisspäivässä
- Projektien yhteinen Kick-off pidetty 13.2.
- Taustamateriaalia käyty läpi ja sitä kautta hahmoteltu tietomallia
- Suurin osa maakunnista on nimennyt ensimmäiset edustajansa
- Tietomallin perusrakenne (näkökulmat ja dimensiot) hyväksytty maakuntien kesken työpajassa 23.3.2018
- Näkökulmien priorisointi tehty työpajassa 23.3.2018
- Aloitettu järjestäjän päätöksentekorakenteen yleinen järjestäminen tiedon konkreettiseksi kiinnittämiseksi
- Perustettu yhteiset työtilat
- Maakuntien oma työskentely aloitettu

Kumulatiivinen kokonaiseuranta (eur) ?

Kustannusjaottelu	Budjetti	Toteuma	Sidotut	Ennuste
Palvelujen ostot	0 €	0 €	0 €	0 €
Omat henkilöstökustannukset	0 €	0 €	0 €	0 €
Muut kustannukset	0 €	0 €	0 €	0 €
Välilliset kustannukset	0 €	0 €	0 €	0 €
Yhteensä	0 €	0 €	0 €	0 €

Poikkeamat, ongelmat tai riskit

- Projektin toteutusaikataulu on tiukka. Siksi pystyttävä priorisoimaan tekeminen hyvin, jotta pysytään projektin tavoitteissa.
- Käsitys järjestämisestä vaihtelee maakunnittain jonkin verran. Voi aiheuttaa haasteita tietomallin määrittelylle.
- Työpajan 1 ja 2 tavoitteet ovat vaihtuneet päällekkäin - Työpajassa 1 toteutui tavoite: tiedot määritetään tietoryhmä- ja tietotasolla. Priorisointi tehty. Työpajaan 2 siirtyy tehtävä: indeksi-, indikaattori-, mittari-tason tieto jäsennetään näkökulmien ja dimensioiden alle.

Keskeiset tehtävät seuraavalla raportointikaudella

- Maakuntien keskinäisen yhteistyön käynnistäminen
- Maakuntien oman työskentelyn aloittaminen
- Ensimmäinen työpaja
- Pohjamallien laatiminen
- Maakuntien keskinäisen yhteistyön jatkaminen ja syventäminen
- Maakuntien oman tiedolla johtamisen sitouttaminen malliin
- Toinen työpaja
- Mallin lähentäminen käytännön konkreettista tiedolla johtamista

Kumulatiivinen kokonaiseuranta (htp) ?

Nimi	Budjetti	Toteuma	Ennuste
Yhteensä htp	0 htp	0 htp	0 htp

RAPORTTIHISTORIA

Raportointijakso	Edist.	Aik.	Kust.	Laatu	Laaj.	Henk.	Riski	Hyö.	Hanke- tai Projektin- päällikkö	Aloituspvm ja valmistuspvm	Kumul. kok.seuranta (eur)				Kumul. kok.seuranta (htp)		
											Budjetti	Toteuma	Sidotut	Ennuste	Budjetti	Toteuma	Ennuste
26.3.2018 Huovila Mikko									Huovila Mikko	18.1.2018	0 €	0 €	0 €	0 €	0 htp	0 htp	0 htp
7.3.2018 Huovila Mikko									Huovila Mikko	18.1.2018	0 €	0 €	0 €	0 €	0 htp	0 htp	0 htp

Perustiedot

Tila	Käynnissä
Hankkeen / Projektin nimi	DM 4.1.3 Maakunnan tiedolla johtamisen TJ-arkkitehtuuriselvitys
Hanke- tai Projektipäällikkö	Hakala Timo
Aloituspvm ja valmistuspvm	18.1.2018 - 15.6.2018
Raportointijakso	26.2.2018 - 31.3.2018
Riskit ?	0 riskiä

Liikennevalot ?

Edistyminen	🕒 20%
Aikataulu	🟢 Suunniteltu
Kustannukset	🟢 Suunniteltu
Tuotosten laatu	🟢 Suunniteltu
Tuotosten laajuus	🟢 Suunniteltu
Henkilöstö	🟢 Suunniteltu
Riskit	🟢 Suunniteltu
Hyödyt	🟢 Suunniteltu

Raportin liitteet ja linkit

Yleistilanne suhteessa hanke-/projektisuunnitelmaan

Projektin tilanne on hyvä. Ensimmäinen varsinainen työpaja lähtölaukausseminaarin jälkeen on pidetty ja välitehtävät maakunnille on lähetetty.

Keskeiset aikaansaannokset raportointikaudella

Työ on päässyt käyntiin. Uudenmaan toimesta otettu kiinni aloitusseminaarin jälkeistä viivästystä. Kotitehtävät on laadittu ja lähetetty (työpaja 1). Vastauksia odotetaan 6.4.

Työpajan 2 suunnittelua on tehty.

Kumulatiivinen kokonaisseuranta (eur) ?

Kustannusjaottelu	Budjetti	Toteuma	Sidotut	Ennuste
Palvelujen ostot	0 €	0 €	0 €	0 €
Omat henkilöstökustannukset	0 €	0 €	0 €	0 €
Muut kustannukset	0 €	0 €	0 €	0 €
Väilliset kustannukset	92 500 €	0 €	0 €	0 €
Yhteensä	92 500 €	0 €	0 €	0 €

Poikkeamat, ongelmat tai riskit

Projektin riskinä on edelleen kireä aikataulu. Projekti päättyy 15.6.2018. Projektien (4 kpl) yhteinen seminaari on 19.6.

Keskeiset tehtävät seuraavalla raportointikaudella

Esitellään ensimmäisen työpajan jälkeen lähetetyt kotitehtävät ja niiden tulokset työpajassa 2.

Tietojärjestelmien lokerointi on alkanut niiden funktioiden mukaan sote-johtamisen näkökulmasta. Tässä hyödynnetään Järjestäjän digityövälineet -projektin materiaalia.

Kumulatiivinen kokonaisseuranta (htp) ?

Nimi	Budjetti	Toteuma	Ennuste
Yhteensä htp	0 htp	0 htp	0 htp

RAPORTTIHISTORIA

Raportointijakso	Edist.	Aik.	Kust.	Laatu	Laaj.	Henk.	Riski	Hyö.	Hanke- tai Projekti-päällikkö	Aloituspvm ja valmistuspvm	Kumul. kok.seuranta (eur)				Kumul. kok.seuranta (htp)		
											Budjetti	Toteuma	Sidotut	Ennuste	Budjetti	Toteuma	Ennuste
26.2.2018 - 31.3.2018 Hakala Timo	🕒	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	Hakala Timo	18.1.2018 - 15.6.2018	92 500 €	0 €	0 €	0 €	0 htp	0 htp	0 htp
1.3.2018 - 31.3.2018 Hakala Timo	🕒	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	Hakala Timo	18.1.2018 - 15.6.2018	92 500 €	0 €	0 €	0 €	0 htp	0 htp	0 htp


360-näkymä Maakunnan toimintaan (tuloksellisuus)

Näkökulmat/ Ulottuvuudet, joita indikaattorit ja mittarit kuvaavat, joihin ne kiinnittyvät

Toiminta- ympäristö Perustied	Voimavarat,	Voimava- rojen koh- dentamin	(Kestävä) Talous	Taloudel- lisuus	Tuottavuus	Palvelukyky	Asiakas- tietämys / ymmärrys	Laatu	Vaikuttavuus	Kustan- nusvaikut- tavuus	Kehittyminen innovatiivisuus
Perustiedot Ympäristö	Tuotannon tekijä Määrät	Allokaatio	Suunnitelma/ Toteuma/ Ennuste	Kustannukset/ asukas	Kokonais-tuottavuus	Odotusajat	Asiakas-kokemus	Palvelun tuotoksen laatu	Palv Vaikutus asiakkaaseen	Vaikuttavuus/ kustannukset €- määrinen	Innovaatio aihiot
Perustiedot Toimijat	Tuotannon tekijä Laatu	Palvelu-portfolio	Käyttötalous	Kustannukset/ asiakas	Osa-tuottavuudet	Läpimenoajat	Asiakas-tyytyväisyys	Prosessinlaatu	Yhteiskun- nallinen vaikuttavuus	Vaikuttavuus/ kustannukset ei- määrinen	Kehittyminen hankkeissa
Elinolot	Osaaminen	Tarjonta Tarjooma	Tulos	Kustannukset/ suorite	Henkilötyö tuottavuus	Saatavuus	Asiakas-palaute	Resurssienlaatu	.	.	
Hyvinvointi Terveystila	Motivaatio tyytyväisyys	Kapasiteetti.	Investoinnit			Saavutet- tavuus	Asiakas-kunta				
.	Tuottaja- ekosysteemi	Palvelumuoto	Rahoitus			Tarve / Tarjonta	Asiakastarve				
		Yhdenver- taisuus	Tase			Osallistumi- nen ja oikeudet	Palvelukäyt- täytyminen				
			Kustannukset/ Palvelu			Yhdenver- taisuus	Palvelujen käyttö				
						Integraatio	Peittävyys				
						Valinnan- vapaus					

LUONNOS

Järjestämisen yhdenmukaisuus?



Toiminta- arkkitehtuuri

Keski-Suomi:
Toimialariippumaton
toiminnan kuvaus
järjestämisestä

P-Karjala & P-Pohjanmaa:
SOTE järjestämisen kriittiset
päätöksenteon vaiheet

Valtakunnalliset toimijat:
yhteinen palvelujäsennys

Ensisijainen tehtävä

Toissijainen tehtävä
(tehdään, jotta kyetään hoitamaan
ensisijainen tehtävä)

Tieto- arkkitehtuuri

P-Karjala & P-Pohjanmaa:
SOTE-käsitelmä ja SOTE-
tietomalli ja niiden
hallintamalli

Uusimaa:
tietovarannot

Valtakunnalliset toimijat:
kansalliset tietovarannot

Tietojärjestelmä- arkkitehtuuri

Keski-Suomi:
Kuvaus
toimialariippumattomista
tietojärjestelmäpalveluista
(sis. Asiakkuudenhallinta)

Uusimaa:
Kuvaus nykytilan ratkaisuista
ja niiden hyödyntämisestä

Uusimaa:
Kuvaus uusista tarvittavista
ratkaisuista

Uusimaa:
työnjako valtio & maakunnat

Valtakunnalliset toimijat:
tietojärjestelmäratkaisut
