



VALTIOVARAINMINISTERIÖ
FINANSMINISTERIET


Valtionavustusten kehittämis- ja digitalisaatiohankkeen roadmap

20.1.2021

Hankesuunnitelman (version 2.0) liite 1

Valtionavustustoiminnan kehittäminen ja digitalisointi -hanke

Askeleita ja selvityksiä kohti hanketta

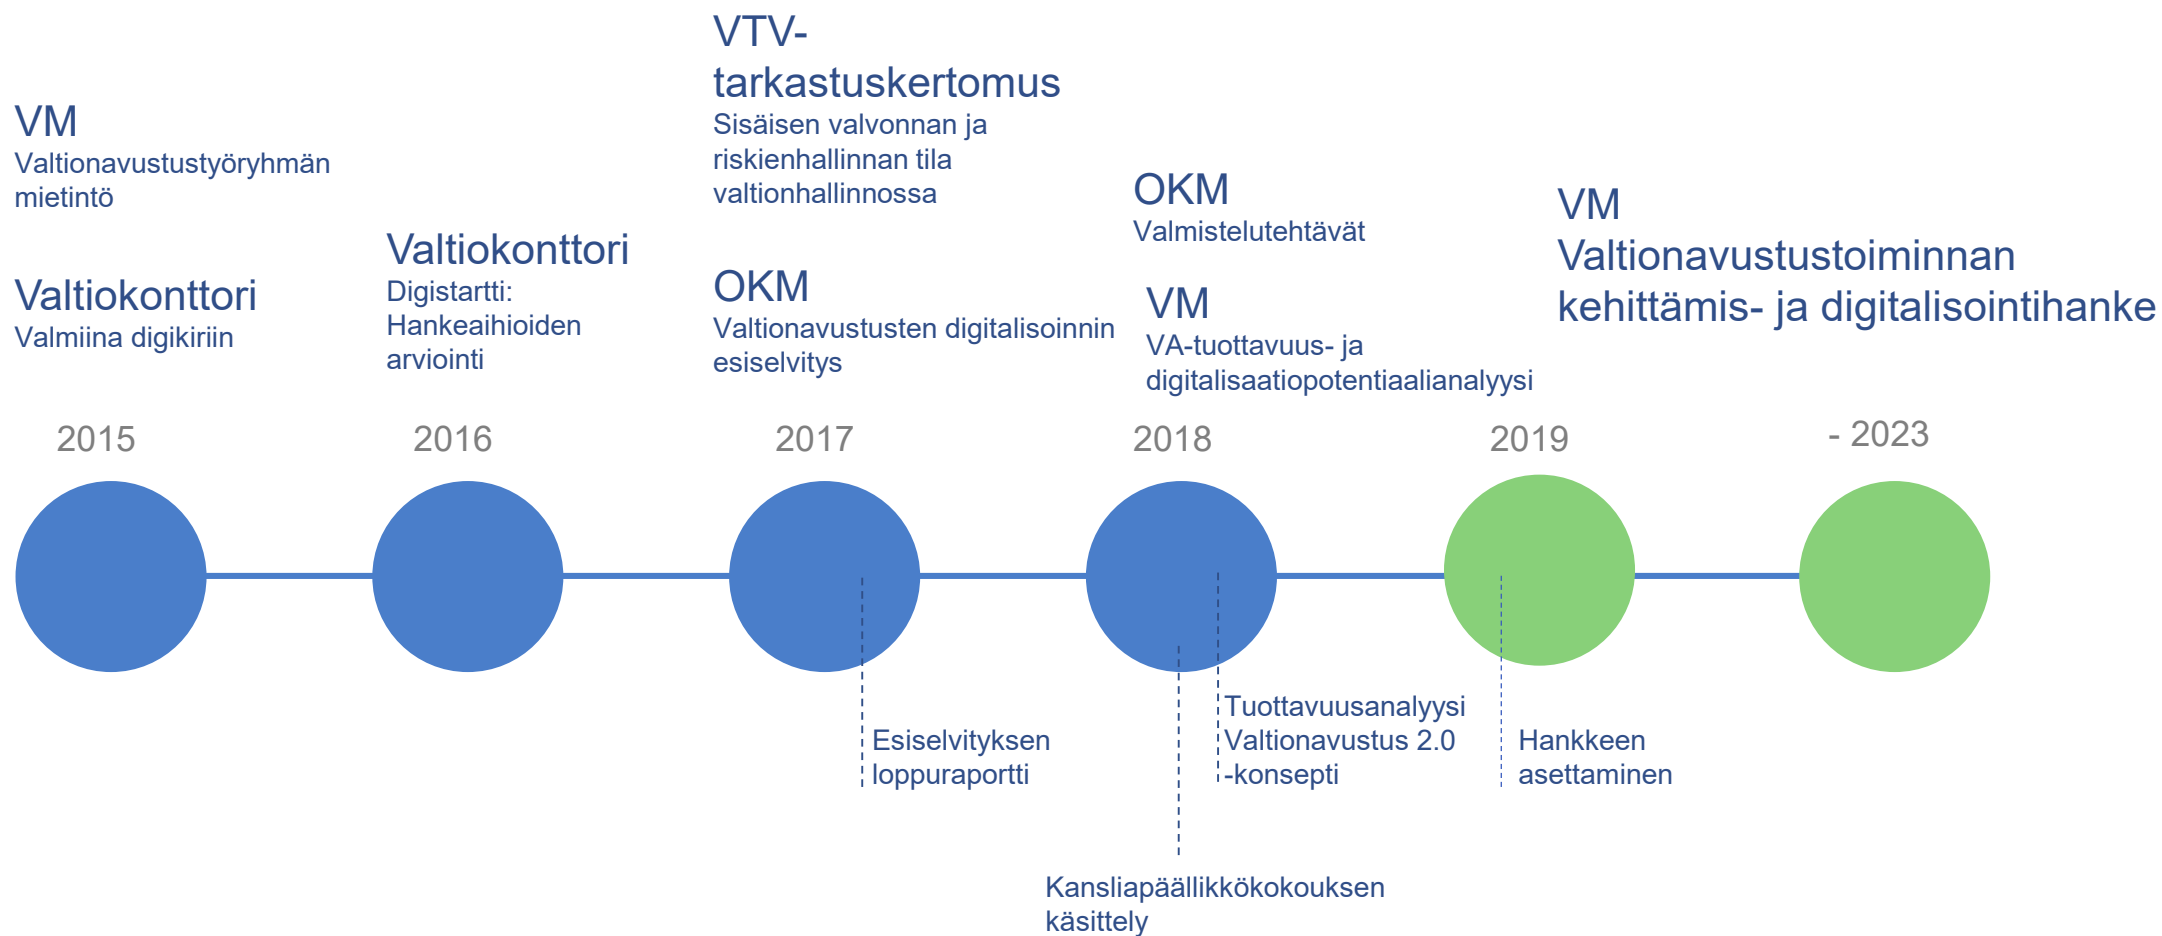

Hankkeen projektit

- Roadmapissa on esitetty eri hankkeiden projektien päätehtävät aikatauluineen eri värikoodeilla. Tehtävät ja aikataulut on esitetty tarkemmalla tasolla jokaisen projektin projektisuunnitelmassa.

Projekti	Projektin värikoodi	Projektipäällikkö t. muu vastuuhenkilö	Osallistuvat hanketoimistosta	Muut osallistuvat tahot, yhteistyökumppanit
Hankehallinta		Merja Irjala	Tuula Lybeck	Gofore, CSC (aiemmin Gartner, Hansel)
Lainsäädäntömuutokset		Jouko Narikka (HE liittyen järjestelmän käyttöönottoon) Merja Leinonen (toinen HE va-lain muutoksista)	Tuula Lybeck Merja Irjala Joose Niemi Marita Virtanen Jaana Walldén	Lainsäädäntöjaosto Valtiokonttori ja muut sidosryhmät
Käsitteet ja sanasto		Satu Lindberg	Marita Virtanen Jaana Walldén	CSC, va-viranomaiset ja hakijat
VA-toiminnan muutos		Jaana Walldén	Marita Virtanen Mikko Lehtonen Ulla Suomela Tuula Lybeck Satu Lindberg	Järjestöjaosto Kuntajaosto CSC Va-viranomaiset ja hakijat
VA-tietojärjestelmän toteuttaminen		Anu Mäkinen	Joose Niemi Satu Lindberg Marita Virtanen	Solita CSC Valtiokonttori ICT-jaosto Va-viranomaiset ja hakijat
Analytiikka ja AI		Joose Niemi	Hanketoimisto	
Palvelutuotanto		Laura Sorva	Tuula Lybeck Merja Irjala	

VA-hankkeen roadmap 2018-2023

04-12/2018

Asettamista tukeneiden tehtävien koordinointi

01-12/2019

01-06/2020

Hankkeen
asettaminen

Kustannusarvioselvitys

Hankkeen resurssien ja suunnittelun varmistaminen

Palvelutuotannon järjestämismalli

Toimeksianto
Valtiokonttorille

Tietohallintolain mukainen lausuntomenettely

Käyttöönottojen tiekartta (pohjadatakyselyt)

Selvitys ja uudistuksen käyttöönottoa edellyttävien lainsäädäntömuutosten arviointi

Sanaston sisällön tuottaminen (vaiheet 1-4)

Sanaston sisällön tuottaminen (vaihe 5)

Sanaston 1. osan lausuntokierros

VA-ratkaisun muotoilu palvelumuotoilemalla valmisteluvaihe

VA 2.0 –toimintamallin määrittely, va-toiminnan prosessit, toimijat ja roolit

Suunnittelun ja arvioinnin osa-alueiden kehittäminen ja strategisen tason palvelupolku

Hakijan palvelupolku

Vaikutavuuden periaatteet ja viitekehys

Pilotit (UM, OKM, EUSA ja PSR)

Hakijaryhmäkohtainen kehittäminen (järjestöt)

Toiminnallinen määrittely ja tietojen mallinnus

Käyttäjätarinat ja tietojen mallinnus

Tekninen suunnittelu, teknologia- ja toteutustyön tavan valinta

VA-tietojärjestelmien nykytila ja tarpeet sekä toteutustyössä hyödyntämisen mahdollisuudet

Toteutustyön mahd. hankinnan valmistelu ja hankinta

VA-hankkeen roadmap 2018-2023


07-08/2020

09/2020

10/2020

11/2020

12/2020

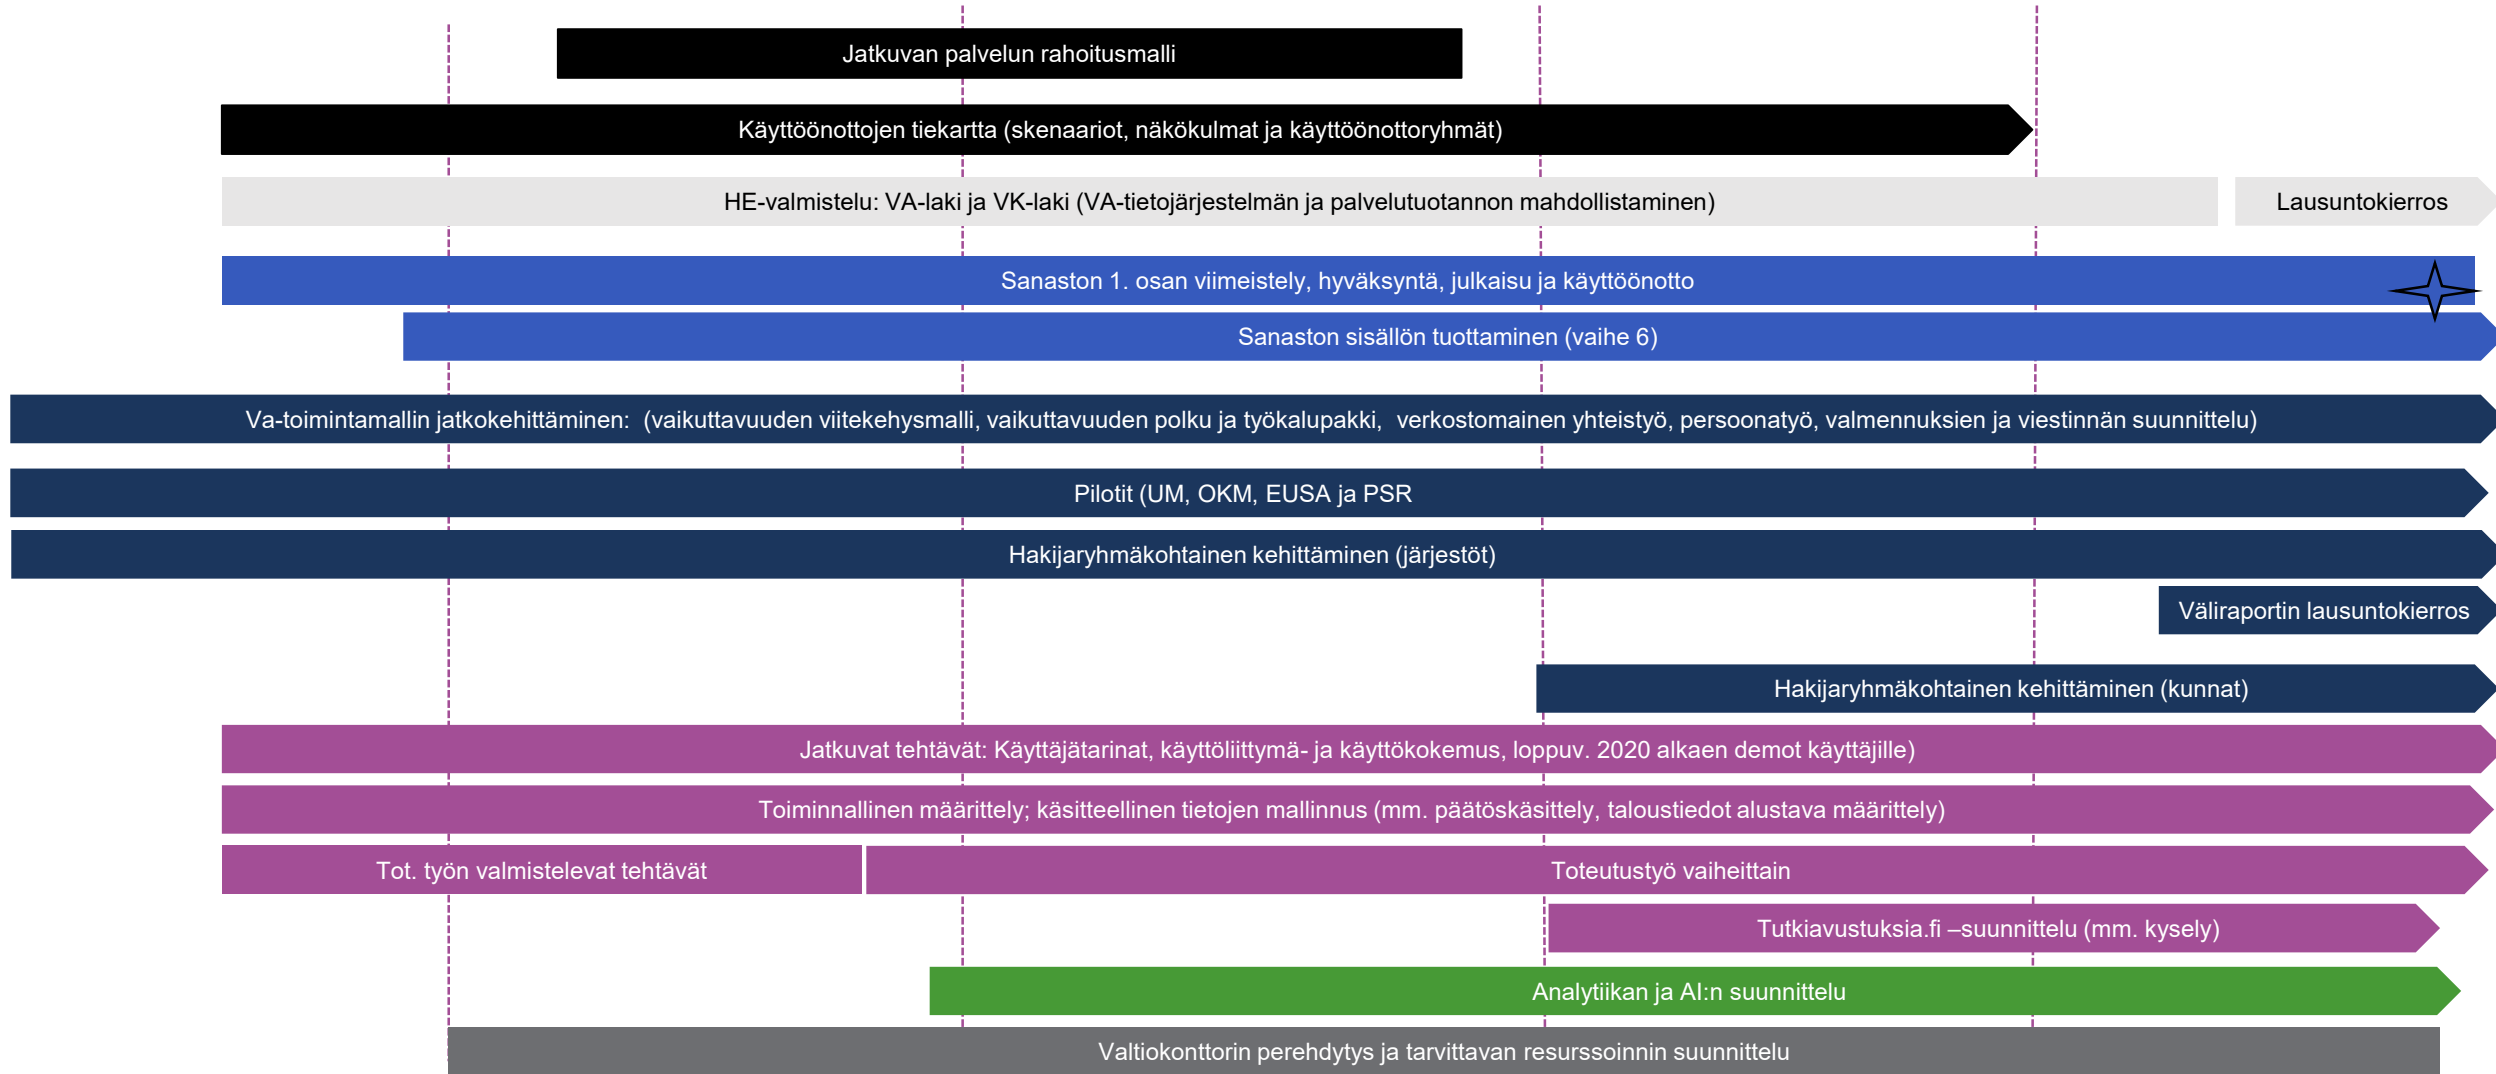

VA-hankkeen roadmap 2021

01/2021

02/2021

03/2021

04/2021

05/2021

06/2021

Ohry

Seury




Ohry


Seury

Ohry

Ohry

Seury

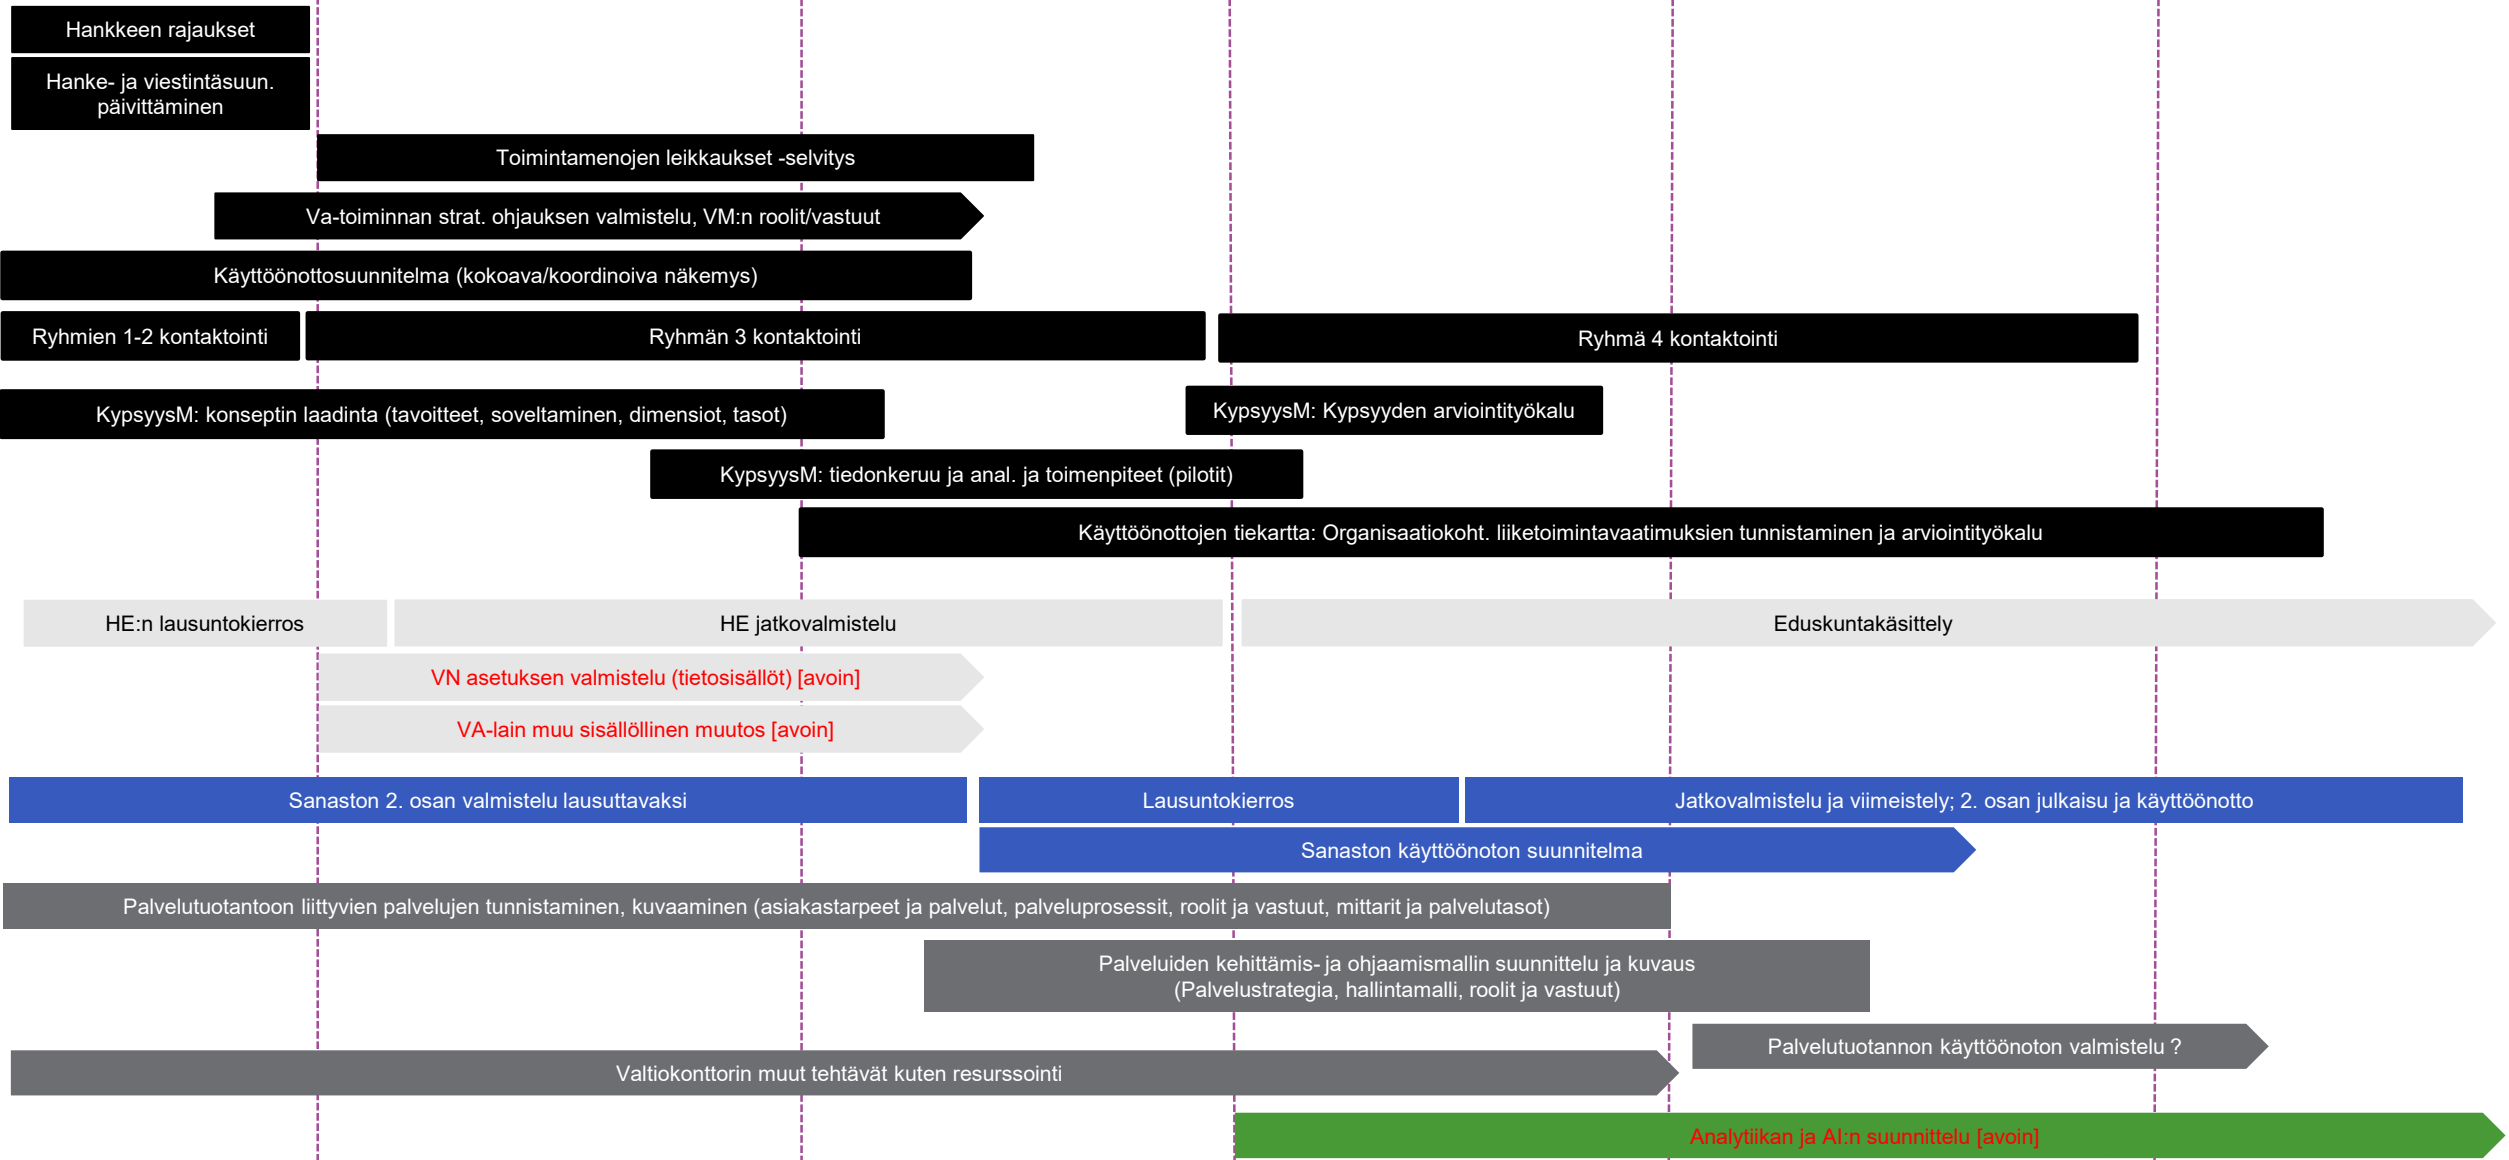

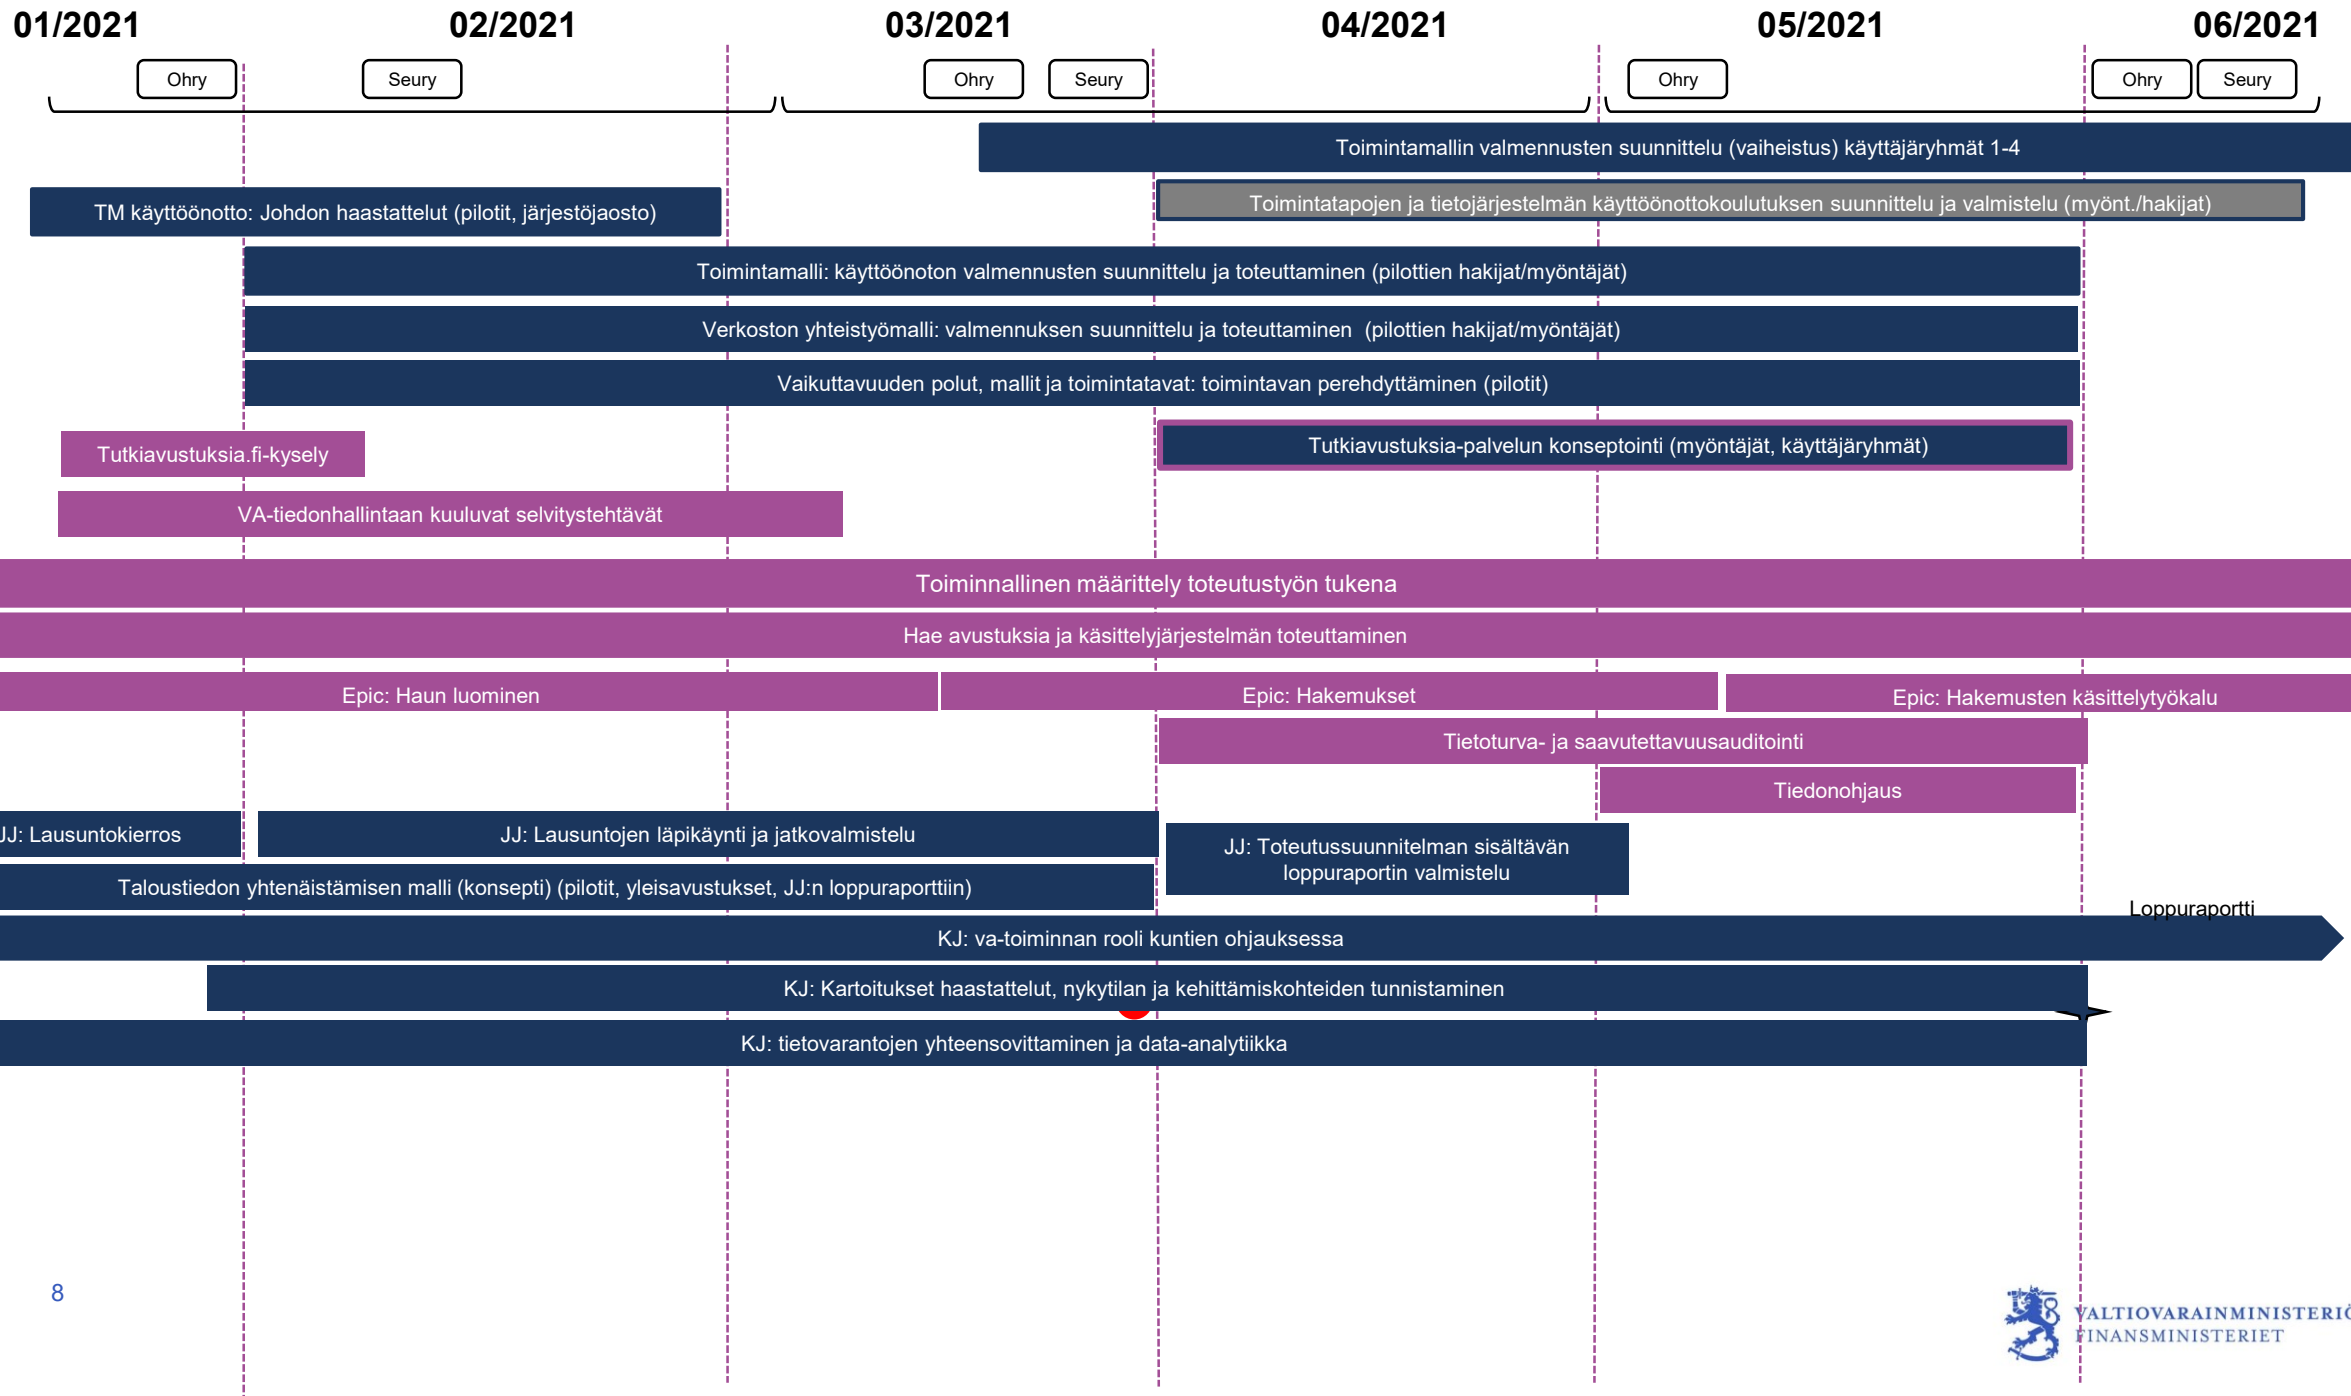

VA-hankkeen roadmap 2018-2023


07-08/2021

09/2021

10/2021

11/2021

12/2021

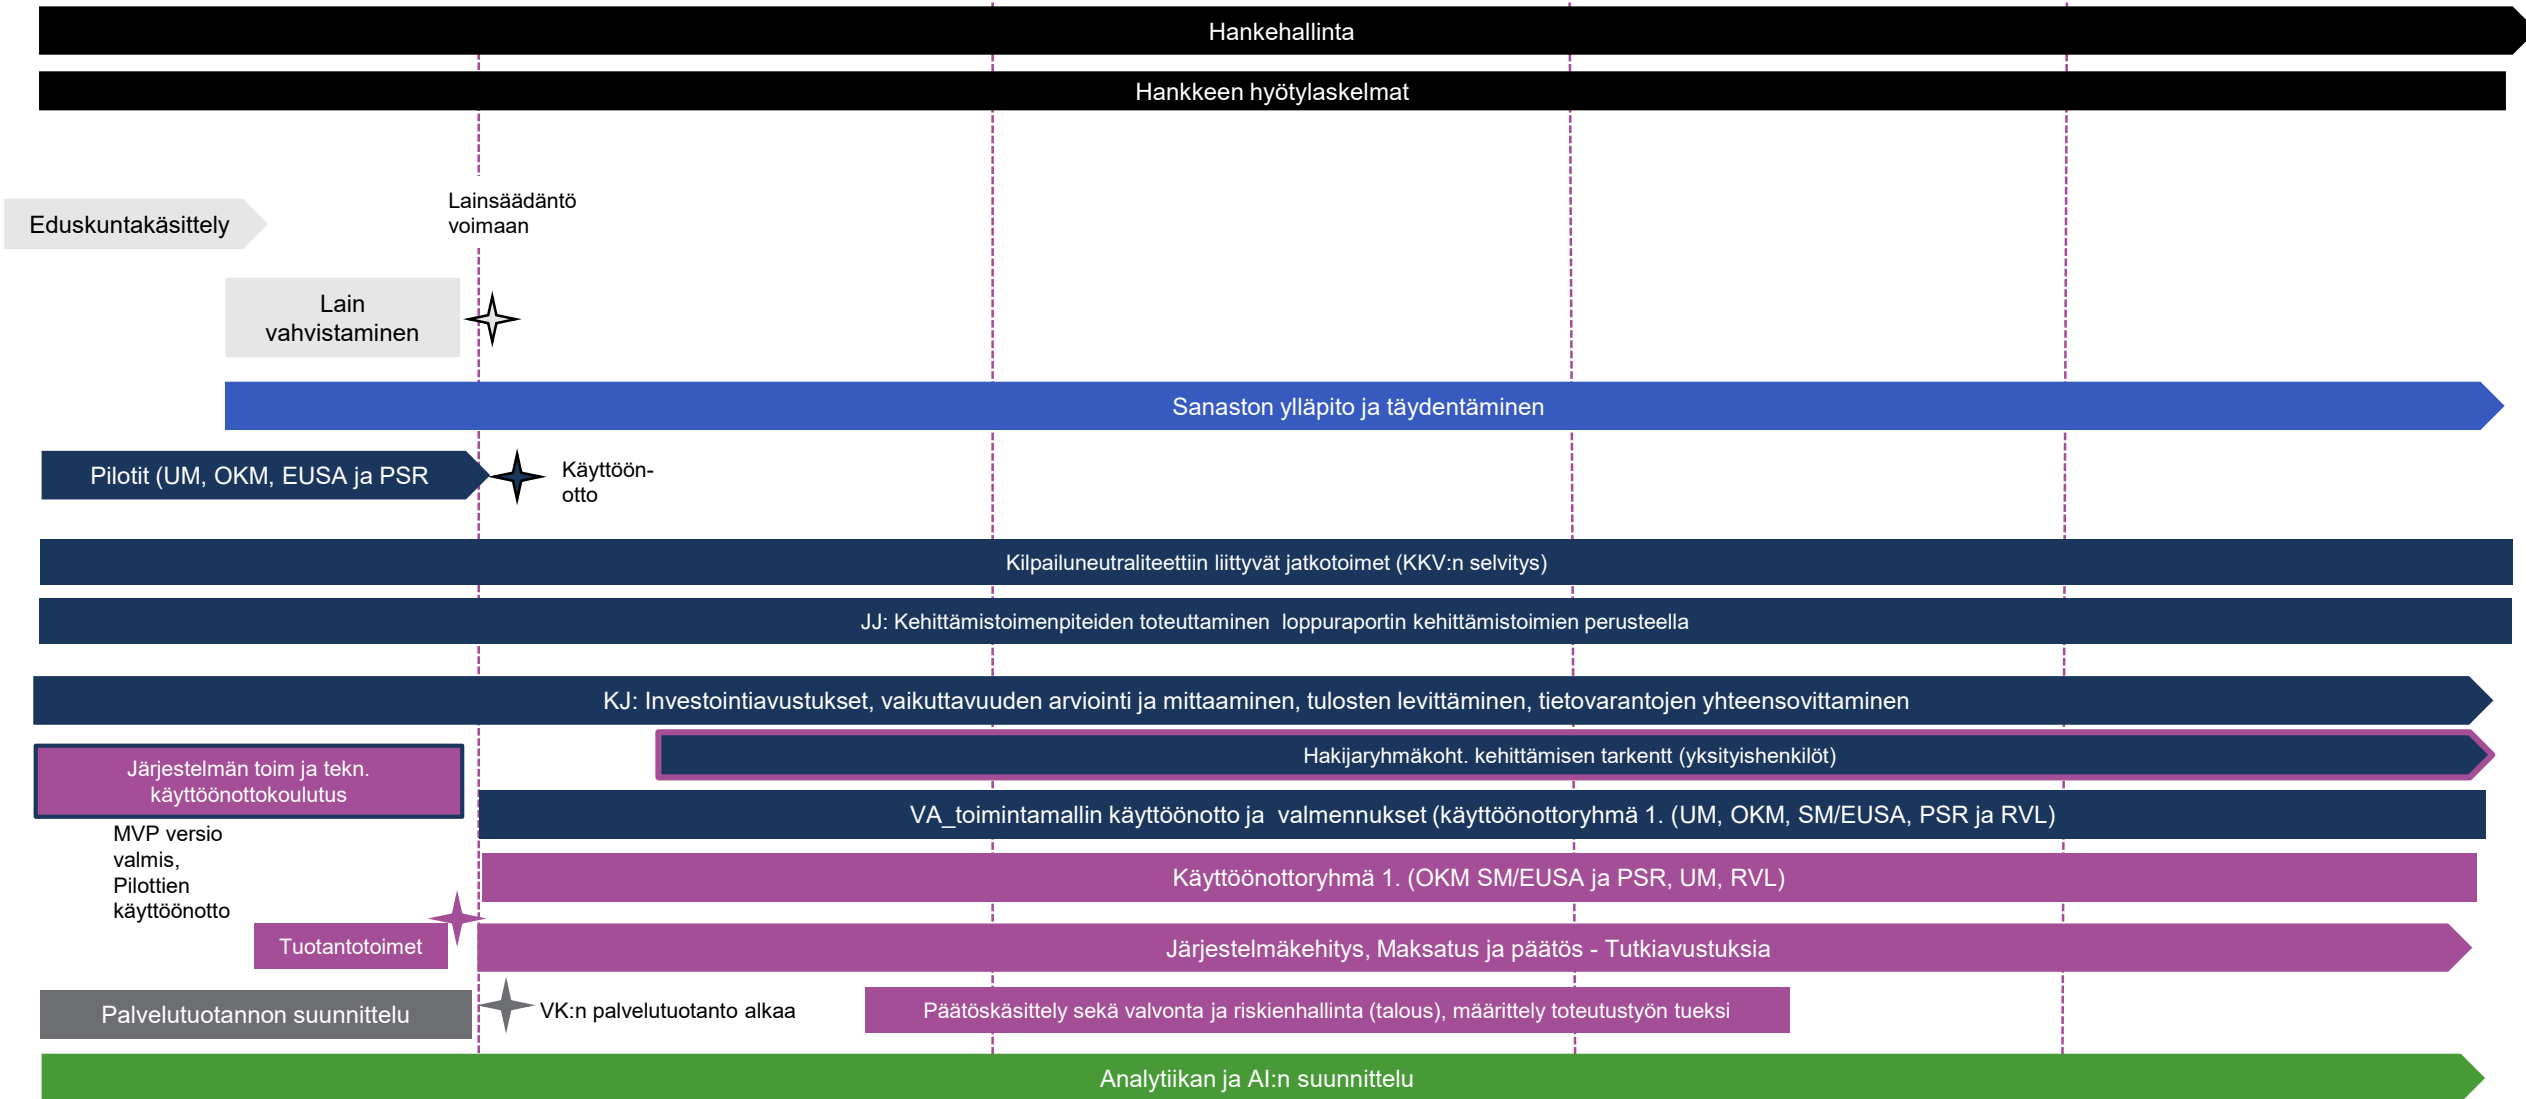

VA-hankkeen roadmap 2018-2023

2022

2023

Hankkeen päättämisen toimet

Yhtenäiset kriteerit (kestävä kehitys, tasa-arvo jne.)

Hakijaryhmäkoht. kehittämisen tarkentt (yksityishenkilöt)

Hakijaryhmäkoht. kehittämisen tarkent (korkeakoulut)

Hakijaryhmäkoht. kehittämisen tarkent (yritykset)

Käyttöön-
otto ryhmä 1.

KJ: Hakijaryhmäkohtainen kehittäminen

Loppuraportti

VA-toimintamallin käyttöönotto ja valmennukset
(käyttönottoryhmä 2. (OKM, UM))

Käyttöön-
otto ryhmä 2.

Käyttöönotto ryhmä 2. (OKM UM)

VA-toimintamallin käyttöönotto ja valmennukset
(käyttönottoryhmä 3. (kevät))

Käyttöönotto ryhmä 3 (kevät)

Käyttöön-
otto ryhmä 3
(kevät)

VA-toimintamallin käyttöönotto ja valmennukset
(käyttönottoryhmä 3. (syksy))

Käyttöönotto ryhmä 3 (syksy)

Käyttöön-
otto ryhmä 3
(syksyt)

VA_toimintamallin käyttöönotto ja valmennukset
(käyttönottoryhmä 4)

Käyttöönotto ryhmä 3 (syksy)
