

The background of the slide features a series of white, curved architectural lines that create a sense of depth and movement, resembling the interior of a modern building or a tunnel. The lines are arranged in a way that they appear to converge towards the center, creating a focal point for the text.

Findynet-hankkeen ohjausryhmän kokous

7.12.2023

Agenda

- Kokouksen järjestäytyminen
- Pöytäkirjantarkastajien valinta
- Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan katsaus
 - Kokeiluhanketyöryhmän uutiset
 - Teknologiatyöryhmän uutiset
 - Strategiatyön tilanne
- Esittelyasiat ja päätökset
 - Esitellään valtionavustuksen käytön tilanne
 - Esitellään hankkeen keskeisimmät riskit ja niiden hallinta
- Muut asiat
- Kokouksen päättäminen

Kokeiluhankkeet ja liiketoiminnan kehitys

- **Joukkoliikenteen alennustodisteen kokeiluhanke**
 - Yhteistyö Kelan ja HSL:n kanssa jatkuu, keskittyen erityisesti eläkeläisyyden todistamiseen. Konsortiosopimusta viimeistellään. Tavoitteena hankkeen aloittaminen Q1/2024 alkupuolella.
 - Muita potentiaalisia todisteita ja kumppaneita: opiskelijatodiste (Nysse, OPH), varusmiestodiste (Puolustusvoimat, VR)
- **Vahvistettu eKuitti -kokeiluhanke**
 - Jatkuvat neuvottelut ja yhteistyö potentiaalisten osallistujien kanssa (ReceiptHero, Visma, Accountor Finago, Posti, OP + muut)
 - Keskustelut keskittyvät toimijoiden sitouttamiseen ja mahdollisen aloituksen ajoittamiseen Q1/2024.
- **Turvallinen asiointikanava**
 - Keskustelut useiden pankkien ja vakuutusyhtiöiden kanssa turvallisen asiointikanavan tarpeesta (Osuuspankki, OP Henkivakuutus, Nordea Pankki, Nordea Rahoitus, Säästöpankkiliitto, S-Pankki, LähiTapiola ja Kela)
 - Konseptia on käyty läpi myös ja DVV:n ja Tietoevryn kanssa. Tietoevry kehittänyt klikattavan prototyypin.
 - Potentiaalisin lähestymiskulma tällä hetkellä on suostumukset ja valtuutukset.
- **Kumppaniohjelma**
 - Alustava suunnitelma kumppaniohjelmalle, jolla pyritään laajentamaan Findynet-ekosysteemiä ja vahvistamaan Findynetin markkina-asemaa.
- **Brändin ja verkkosivujen uudistus**
 - Uudistuksen tavoitteena luoda tyylikäs brändi-ilme ja selkeyttää viestintää.
 - Mainostoimisto Höyryn valinta toteuttajaksi, tavoitteena saada uudistus valmiiksi Q4/2023 aikana.

Teknologia ja digitaaliset ratkaisut

- Kokeiluhankkeiden teknologiavalinnat
 - Osuuskunnan hallitus hyväksyn teknologiatyöryhmän esityksen kokeiluhankkeissa käytettävistä teknologioista. Kokeiluhankkeissa sovelletaan tarpeen mukaan erilaisia teknologioita. Teknologiavalintoja päivitetään jatkuvasti tarpeiden muuttuessa
 - Attribuuttitodisteella tapahtuvan henkilöllisyyden varmistamisessa käytetään EUDI ARF -viitearkkitehtuurin mukaisia ratkaisuja.
- Suositeltavat SSI-ratkaisut:
 - Osuuskunnan hallitus hyväksyi teknologiatyöryhmän linjaukset kokeiluhankkeissa suositeltavista SSI-ratkaisuista
 - Potentiaalisia toimittajia ovat kokeiluhankkeesta riippuen Indicio, Lissi, esatus, Procivis, SICPA ja DVV
- Osuuskunnan SSI-ratkaisun valinta
 - Osuuskunta on aloittanut neuvottelut valitun toimittajakandidaatin kanssa
 - Tavoitteena solmia vuoden 2024 loppuun ulottuva jälleenmyyntisopimus.
 - Valitulla SSI-ratkaisun toimittajakandidaatilla on ymmärrys oikeushenkilöidentiteetin ja oikeushenkilölompakoiden konsepteista sekä tukee mm EUDI ARF:ssa mainittuja teknologioita.
 - Osuuskunnan pyrkii tarjoamaan SSI-ratkaisun, jota kokeiluhankkeisiin osallistuvat organisaatiot voivat käyttää vahvistettavien todisteiden myöntämiseen, hallintaan, esittämiseen ja vastaanottamiseen
 - Ratkaisu on tarkoitettu organisaatioille, jotka haluavat hankkia SSI-ratkaisun kotimaiselta toimijalta
 - Osuuskunta ei tarjoa luonnollisen henkilön lompakkosovellusta

Strategia v.0.9

Findynet Osuuskunta

2023

EUDI:n ja Findynetin käyttötapausavaruudet 2023-25

Findynetin piirissä voidaan toteuttaa kansallisia käyttötapausavaruuksia myös EUDI-yhteensopivilla teknologioilla, jotta niitä voidaan laajentaa EU-laajuisiksi siinä tapauksessa, että niistä sisältyy sääntelyä eIDAS-asetukseen tai sektorikohtaiseen sääntelyyn.

EUDI tuo EU:n laajuiset käyttötapausavaruudet Findynet-ekosysteemin piiriin.

EUDI luo luottamusinfrastruktuurin, jota Findynet voi hyödyntää (ml. luottamuslistat ja -rekisterit)

EUDI

- EU-laajuinen vahva tunnistautuminen ja organisaatioidentiteetti
- EU:n laajuinen kansallisen viranomaisen vahvistamiin identiteetti- ja rekisteritietoihin perustuva asiointi

Findynet


- Kansalliset käyttötapausavaruudet
- Pääfokuksessa käyttötapausavaruudet joissa kredentiaalilla tapahtuva vahva tunnistautuminen ei ole välttämätöntä ja vahva tunnistautuminen voidaan toteuttaa nyky metodein
- Kansainväliset käyttötapausavaruudet yhteistyössä muiden maiden SSI-toimijoiden kanssa

Visio

- Findynet on julkisen ja yksityisen sektorin yhteinen tiedonvaihdon luottamusverkosto
- Ihmiset ja organisaatiot voivat Findynetin avulla luottaa toisiinsa sekä asioida sujuvasti ja turvallisesti.
- Findynetin avulla osapuolet voivat olla varmoja siitä, kenen kanssa asioivat. He voivat hallita itseään koskevia vahvistettuja tietoja, sekä jakaa niitä toistensa kanssa yksityisyyttä suojaavalla ja luotettavalla tavalla.



Missio

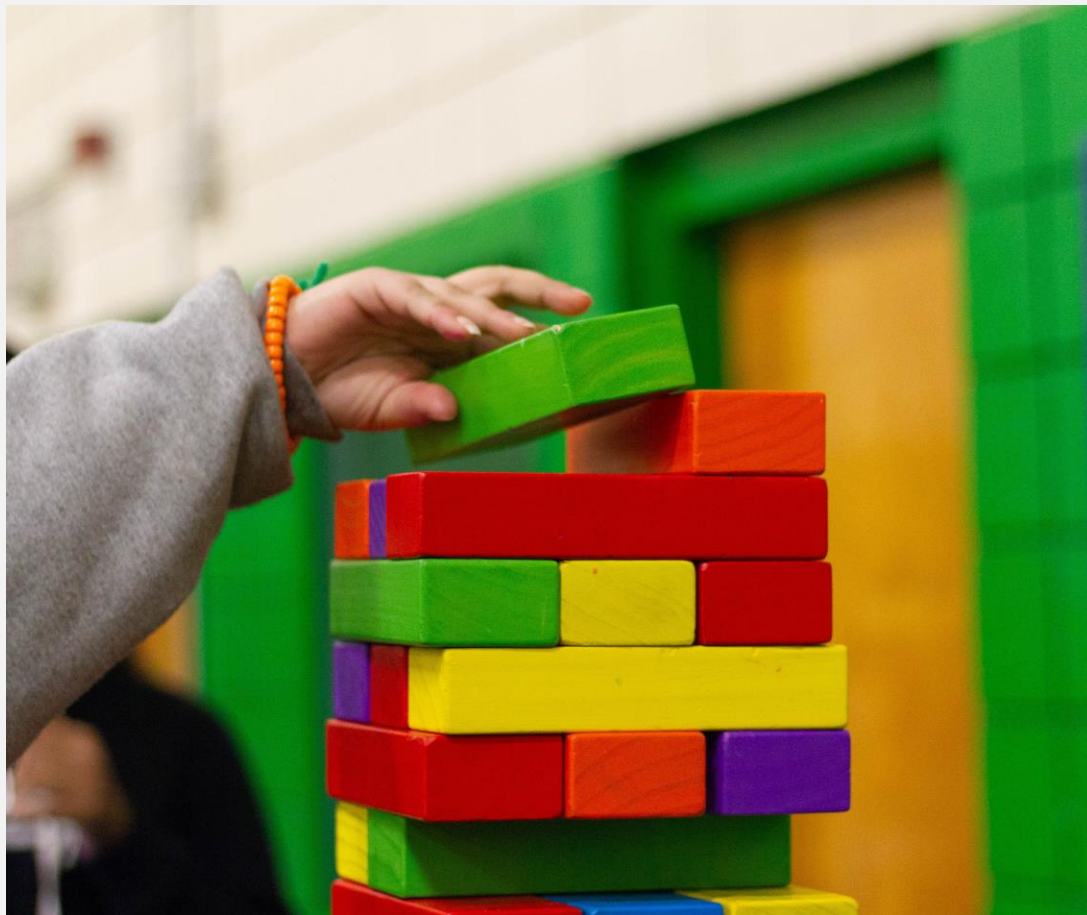

- Tarjoamme digitaalisia ratkaisuja, jotka lisäävät asiointissa tarvittavaa luottamusta.
- Autamme kehittämään yhteisiä toimintamalleja ja sujuvoittamaan asiointia.
- Ratkomme ajankohtaisista ilmiöistä kumpuavia ongelmia edistyksellisillä ratkaisuilla.
- Mahdollistamme Suomen yhteydet eri maiden luottamusverkostoihin.

Arvot

- Lisäämme **luottamusta** niin ihmisten kuin organisaatioidenkin välille vahvistaen ihmisten ja organisaatioiden oikeutta omiin tietoihinsa; toimintamme on yhteisöllistä ja avointa sekä perustuu keskinäiseen luottamukseen.
- Teemme asioita **yhdessä**, edistämme toimijoiden välistä yhteistyötä sekä edistämme yhteisiä toimintatapoja, pelisääntöjä ja ratkaisuja.
- Toimimme ja viestimme **avoimesti**, toivotamme eri toimijat tervetulleiksi yhteistyöhön, hyödynnämme ratkaisuissamme avoimia standardeja, määrittämiä ja lähdekoodia sekä jaamme omia tuotoksiamme muiden hyödynnettäväksi.
- Ratkaisumme ovat **helposti** käyttöön otettavissa ja käytettävissä, viestintämme on selkeää ja ratkaisujemme tarjoamat hyödyt helposti ymmärrettäviä

Strategiset tavoitteet 2024-2025

- Täytämme **valtionavustuksen edellytykset** rakentamalla kansallisen itsehallittavan identiteetin luottamusverkon
- Toteutamme lupaamamme **kokeiluhankkeet**
- Osuuskunnan **liiketoimintamalli** on määritelty
- Osuuskunnan edistämistä kokeiluhankkeista ensimmäiset ovat edenneet tuotantovaiheeseen ja osuuskunta on saanut lisää jäseniä ja asiakkaita
- Osuuskunnan **liiketoiminnan jatkuvuus** on varmistettu
- Findynetin asema Suomen virallisena ”yhteistyöorganisaationa / linkkinä” ulkomaille on vahvistettu

Strategiset tavoitteet 2026-2027

- Findynet on yhteentoimiva eIDAS 2.0 mukaisessa yhteiseurooppalaisessa viitekehyksessä
- Findynetin operatiivinen liiketoiminta ei ole riippuvainen julkisesta tuesta
- Findynet on vakiinnuttanut luotettavan tiedonvaihdon toimintamallinsa Suomessa

The background of the slide consists of numerous white, curved lines that create a sense of depth and movement, resembling the ribs of a large, curved structure or a series of overlapping, curved planes. The lines are most densely packed on the left side and become more sparse towards the right.

Valtionavustuksen käytön tilanne ja hankkeen keskeisimmät riskit

Hankkeen kumulatiiviset kustannukset


Rahoituslähteittäin

	1	2	3
	9/22-3/23	4/23 6/23	7/23 -9/23
Valtionavustus	155k (83,7%)	265k (84,0%)	392k (83,7%)
"Talkootyö"	30k (16,3%)	50k (16,0%)	76k (16,3%)
Osuuskunnan oma rahoitus	0 (0,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)
Yhteensä	186k	316k	468k

Työpaketeittain

	1	2	3	Budjetti
	9/22 - 3/23	9/22 - 6/23	9/22 - 9/23	
Tp 1 Hallinto	45k (24,4%)	73k (23,3 %)	87k (18,5%)	375kEUR (10%)
Tp 2 Palvelut	131k (70,4%)	219k (69,5 %)	348k (74,4%)	3 188kEUR (85%)
Tp 3 Viestintä	10k (5,2%)	23k (7,3 %)	33k (7,1%)	188kEUR (5%)
Yhteensä	186k	316k	468k	3 750k
Käytetty	5 %	8 %	12 %	

Findynet-hankkeen työpaketit

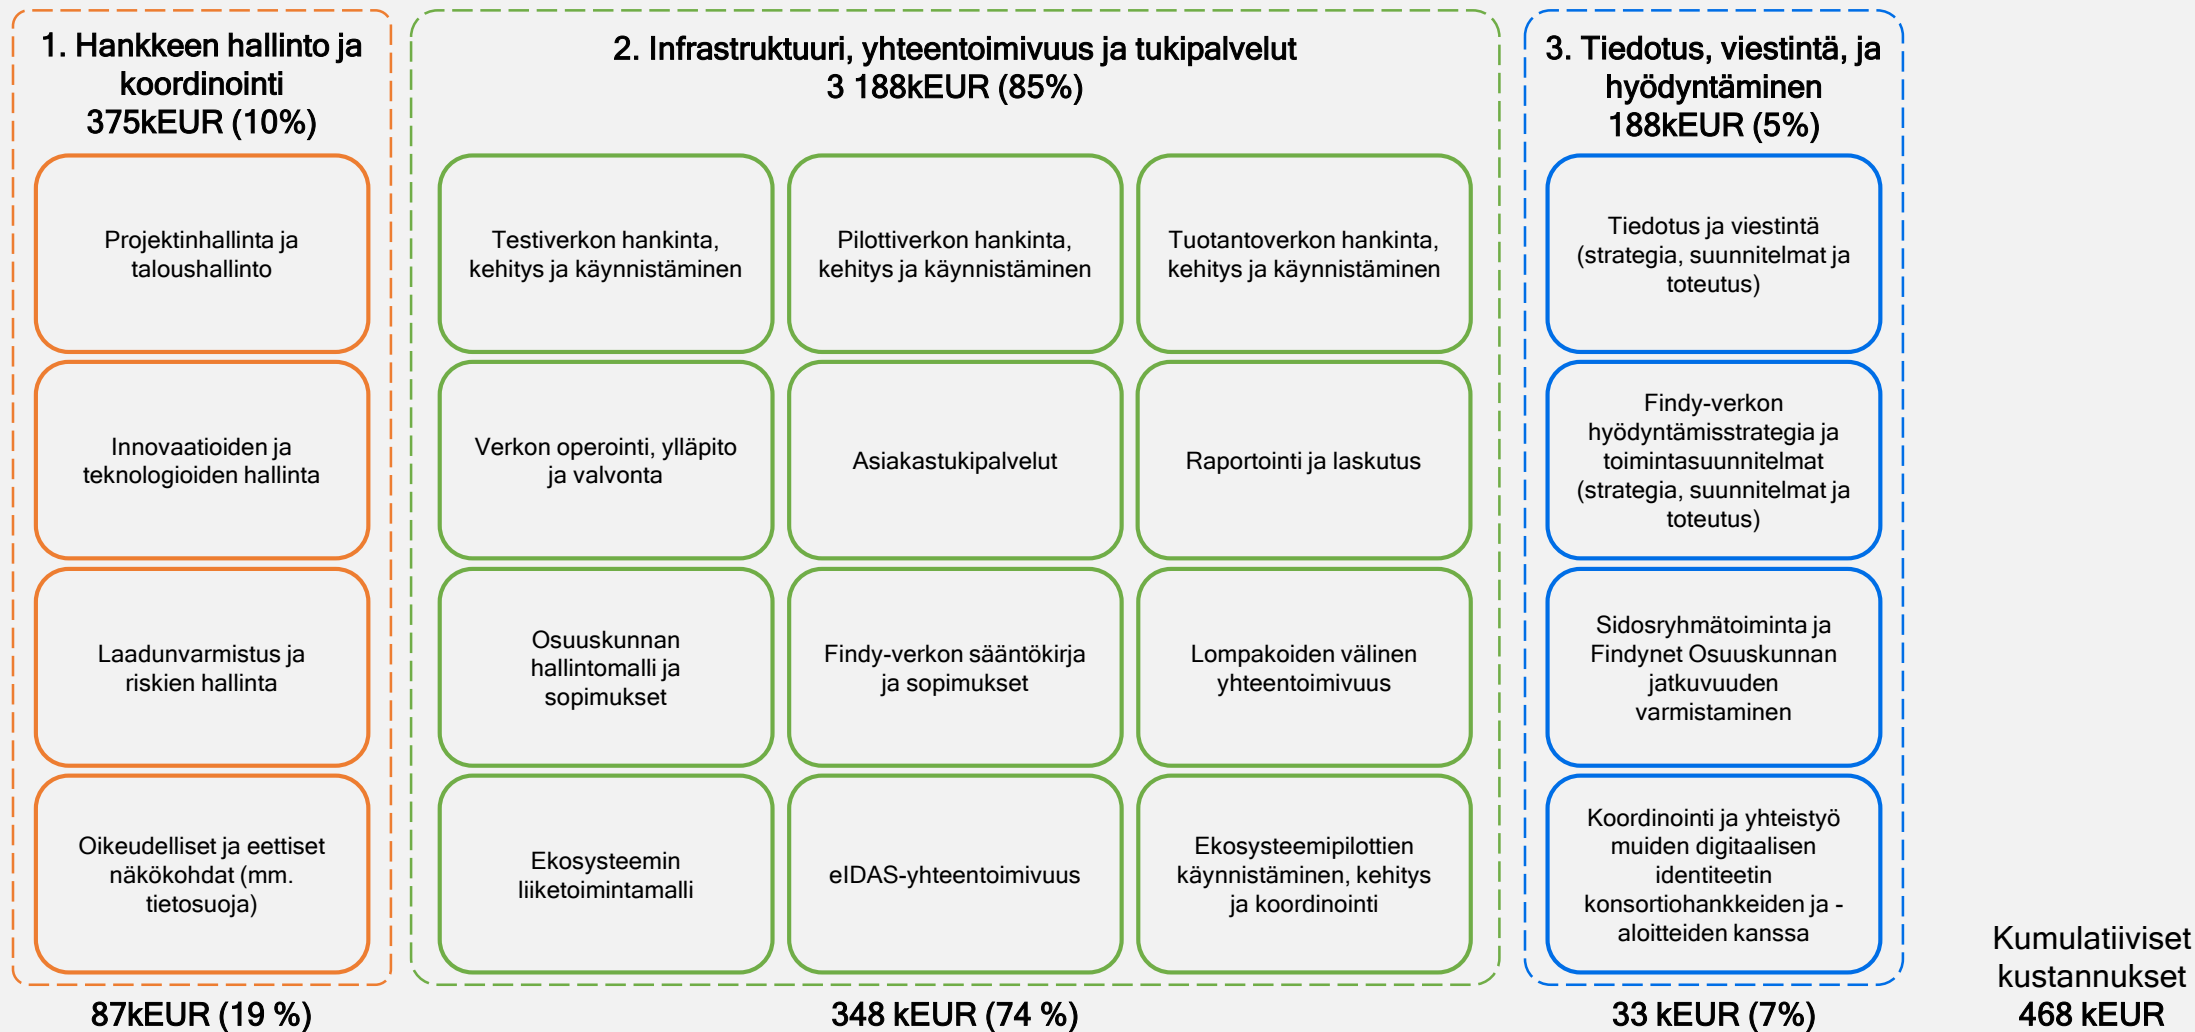

Hankkeen aikataulu

Kuukausi	Vuosi 2022				Vuosi 2023												Vuosi 2024											
	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TP1	TP1 Hankkeen hallinto ja koordinointi																											
T1.1	Projektinhallinta ja taloushallinto																											
T1.2	Innovaatioiden ja teknologioiden hallinta																											
T1.3	Laadunvarmistus ja riskien hallinta																											
T1.4	Oikeudelliset ja eettiset näkökohdat (mm. tietosuoja)																											
TP2	2. Infrastrukturi, yhteentoimivuus ja tukipalvelut																											
T2.1	Testiverkon hankinta, kehitys ja käynnistäminen																											
T2.2	Pilottiverkon hankinta, kehitys ja käynnistäminen																											
T2.3	Tuotantoverkon hankinta, kehitys ja käynnistäminen																											
T2.4	Verkon operointi, ylläpito ja valvonta																											
T2.5	Asiakastukipalvelut																											
T2.6	Raportointi ja laskutus																											
T2.7	Osuuskunnan hallintomalli ja sopimukset																											
T2.8	Findy-verkon sääntökirja ja sopimukset																											
T2.9	Lompakoiden välinen yhteentoimivuus																											
T2.10	Ekosysteemin liiketoimintamalli																											
T2.11	eIDAS-yhteentoimivuus																											
T2.12	Ekosysteemipilottien käynnistäminen, kehitys ja koordinointi																											
TP3	3. Tiedotus, viestintä, ja hyödyntäminen																											
T3.1	Tiedotus ja viestintä (strategia, suunnitelmat ja toteutus)																											
T3.2	Findy-verkon hyödyntämisstrategia ja toimintasuunnitelmat (strategia, suunnitelmat ja toteutus)																											
T3.3	Sidosryhmätoiminta ja Findynet Osuuskunnan jatkuvuuden varmistaminen																											
T3.4	Koordinointi ja yhteistyö muiden digitaalisen identiteetin konsortiohankkeiden ja -aloitteiden kanssa																											

Hankkeen keskeisimmät riskit

Sietämätön riski

Merkittävä riski

#	Riski	Kuvaus	Tod.näköisyys	Vaikutus	Kommentti
R1	Liiketoimintamallin elinkelpoisuus	VM:n rahoituksen päätyttyä Findynet Osuuskunnan tulee toimia omarahotteisesti. Riskinä on, että Findynet Osuuskunnan palveluille ei ole riittävästi kysyntää eikä tulovirralla saada katettua toiminnan kuluja.	Todennäköinen	Kriittinen	Rahoituksen riittävydessä ei toistaiseksi ole ongelmia. Findynetin kaltaisen ja laajuisen ekosysteemihankkeen markkina-adoptiolle aikataulu on äärimmäisen vaativa. eIDAS-asetuksen aikataulu voi osaltaan viivästyttää markkinoiden adoptiota (R12).
R2	Organisaatioadoption puute	Ei saada kokeiluhankkeisiin mukaan kriittistä massaa todisteiden myöntäjiä ja vahvistajia. Tämä aiheuttaa ongelmia Findy-verkon adoptiolle.	Todennäköinen	Kriittinen	Findynetillä rajattu kapasiteetti konseptoida, myydä ja toteuttaa kokeiluhankkeita -> alustava suunnitelma kumppaniohjelmalle, jolla pyritään laajentamaan Findynet-ekosysteemiä ja vahvistamaan Findynetin markkina-asemaa.
R4	Käyttäjien löytyminen	Sekä hankkeen onnistumiselle että Findy-verkon tulevaisuudelle on ensiarvoisen tärkeää, että kokeiluhankkeisiin valikoituvat käyttötapaukset ovat relevantteja isolle joukolle käyttäjiä. Mikäli käyttötapaukset jäävät marginaalisen joukon hyödynnettäväksi, Findy-verkon adoptio voi myös jäädä pieneksi.	Mahdollinen	Kriittinen	Tällä hetkellä työstettävät kokeiluhankkeet keskittyvät laajoja massoja koskettaviin käyttötapauksiin. Tuotannollisten ratkaisujen toteutus ja markkina-adoptio vaatii aikaa.
R5	Lompakkopalvelutarjoajien puute	Digitaalisten lompakoiden markkinat ovat vasta kehitysvaiheessa. Palveluntarjoajat saattavat epäröidä palveluiden tuomisessa markkinoille suuren epävarmuuden vallitessa.	Mahdollinen	Kriittinen	Findynet taklaa tätä omalta osaltaan tuomalla markkinoille organisaatioille tarkoitetun SSI-ratkaisun. Luonnollisen henkilön lompakoita saatavilla useita, mutta niitä ei ole lokalisoitu Suomen markkinalle.
R12	eIDAS2:n viivästyminen	Markkinat jäävät odottamaan eIDAS-asetuksen uudistusta eivätkä investoi Findynet ekosysteemin palveluihin	Mahdollinen	Merkittävä	Tästä indikaatioita etenkin julkisen sektorin osalta (esim OPH). Riskin pienentäminen edellyttää selkeätä viestintää VM:ltä, sekä keskeisten julkisen sektorin toimijoiden aktivoitumista.

Find 
