

OIVA VM/OM/DVV seurantaryhmä

20.9.2022



DIGI- JA
VÄESTÖTIETO-
VIRASTO



Hankkeen tavoitteet ja vaiheistus 2022 – 2026

12,5 Meur

PPO / KET / UET

- OIVA:aan kuuluvat pakolliset ylläpitoon ja pienkehitykseen liittyvät
- KET Vanhemmuuslain asha
- Nimenmuutokset asha

- Lapsen tietojen ilm. asiointi ja asha
- Kuolintietojen ilm. ja rek
- Hetu-uudistus, ulkom. asiointi ja asha
- Muuttoilmoitukset
- Nimenmuutokset asha

- Lapsen tietojen ilm. asiointi ja asha
- Nimenilmoitusmenettelyn kehittäminen
- Kuolintietojen ilm.
- Hetu-uudistus, ulkomaal. asiointi/asha.
- Avioliiton esteiden tutk.
- Muuttoilmoitukset

- Hetu-uudistus, KET prosessit
- Avioehtosopimusten rek

- Kuolinpesän asiointi, autom. sukuselvitys, Suomi.fi valtuudet kuolinpesälle, testamenttirekisteri

9,5 Meur

HOLHOUSTOIMI

- YEV luvat&tilit
- Virkailija-vireillepano
- Elinkaari 1 aloitus
- Myyntilupa-aikaistus

- Elinkaari 1, sähköinen asiointi
- Myyntiluvat
- Edunvalvontavaltuutukset

- Elinkaari 2, muu asiointi,
- Yksityisen edunvalvojan tilinpäätös

- Viimeistely, edunvalvojan asiointinäkömää, kirjanpito

5 Meur

ELSA-ASIANHALLINTA, YDIN/YHTEISET OSAT, PALVELUIDEN LIITTYMINEN ELSA:AN. KEHITYSVAIHEEN YLLÄPITO

2,8 Meur

HOLHOUSTOIMI/SUOMI.FI VALTUUDET EDUNVALVOJAREKISTERI JA ASIOINTI

ASIOINTI / NEUVONTAKANAVAT

1 Meur

2022

2023

2024

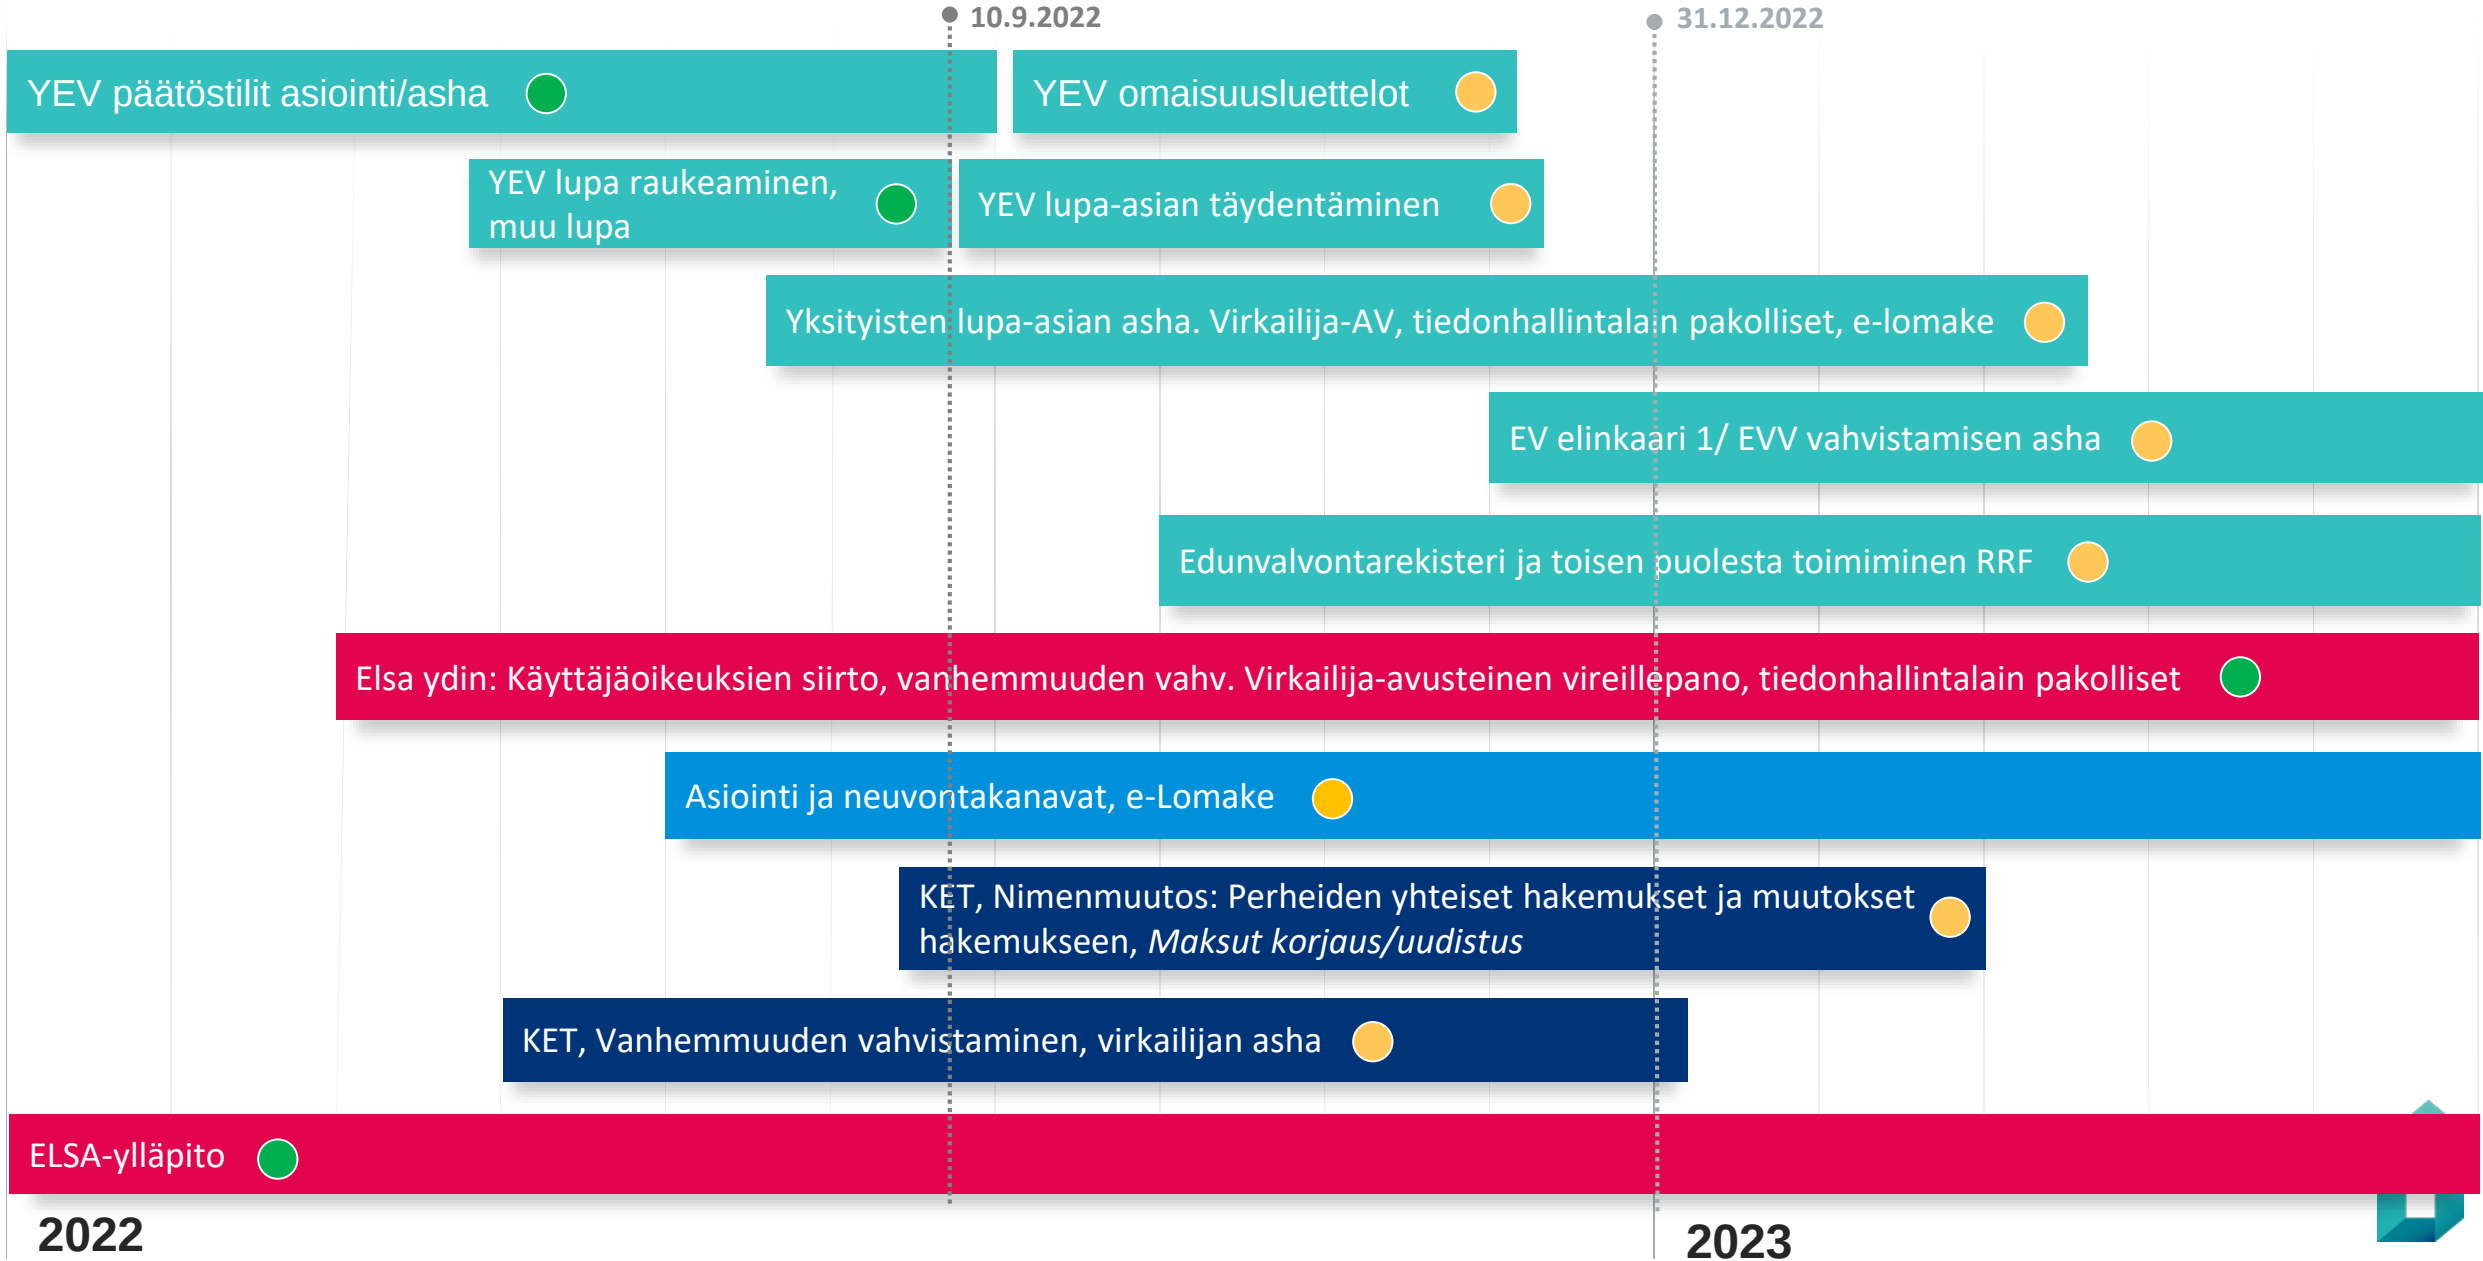
2025





2026



Tiekartta 2022 (8/2022)

Liikennevalo kertoo hankkeen tilan:



Palvelukokonaisuus	Tila	Huomiot
Holhous - YEV tilit ja luvat - YKS ev luvat, virkailijavireillepano, - EVV		Lupa-asiat ovat hieman aikataulusta jäljessä johtuen holhoustiimin voimakkaasta kasvusta
Kotimaiset elämäntapahtumat - Vanhemmuuden vahvistaminen - Nimenmuutokset		Vanhemmuuden vahvistamisen virkailijakäyttöliittymä on jäänyt hieman jälkeen aikataulusta töiden priorisointien johdosta
Muu oikeusturva ja sujuva asiointi - e-Lomake ja asiointi		
Elsa ydin		



Yhteenveto

- Tekemisen draivi on paremmalla tasolla kuin aiemmin.
- Kaikki tälle vuodelle suunnitellut kehittämistiimit ovat nyt mukana kehittämässä
- Alkuvuodesta suurimpiin riskeihin liittynyt vaara resurssipulasta on poistunut ja voidaan varovaisesti todeta kehittämisen osalta resurssitarvearvion olleen joiltain osin yläkanttiin. Myös työn jakautuminen coren ja substanssin välillä on ollut osittain väärin arvioitu
- OIVA-kokonaisuuden kasvattaminen vaikuttaa kehittämiseen. Kehittämistiimi kasvaa n kolmikertaiseksi ja uusien perehdyttäminen ja tekemisen suunnittelu vie paljon aikaa.
- Fokus siirtyy vuoden loppua kohden kuitenkin kasvuvaiheesta tasaisen tuotannon vaiheeseen ja edelleen kehittämissyklin tehostamiseen
- Rahoituksen varmistuminen antaa turvaa ja työrauhaa
- Riskeinä on hyvä varautua valmiiden tuotosten siirtämiseksi palvelujen vastuulle, eli jatkuvaan tuotantoon.
- Hankkeessa on huomattavissa ylläpitovastuun lisääntymistä



Esimerkki lupa-asioiden läpimenoajoista

Ajanjakso 1.1. - 31.8.2022	Ratkaistut asiat	Keskim. käsittelyaika	Nopeimmat 80 %
Luvat			
Maisa	4197 kpl	62,9 pv	35,5 pv
ELSA	1399 kpl	33,6 pv	21,3 pv



Ajankohtaiset hanketason riskit

Ajankohtaiset riskit	Hallintatoimet	Todennäköisyys (1-5)	Vaikutus (1-5)	Riskiluku
Ylläpitotyön suhde kehittämiseen. Hankkeen ylläpitotyön lisääntyminen ja valmiiden palveluiden siirtäminen tuotantoon	Ylläpitotyöhön ja pienparannukseen on varattu ja varataan resursseja (mm. Huoltoweb:n siirto Solitalle vireillä) Kolmikantakeskustelut on aloitettu linjan ja palvelutuotannon kanssa. OIVA toimii aloitteentekijänä ja ohjaa alussa keskustelua.	3	3	9
Hankkeen tuloksellisuus vaikutta tulevaan rahoitukseen.	Jatkuvaa työtä hankkeen kehittämiseksi tuloksellisempaan suuntaan. - Esim. Hyödyn ja kustannuksen arviointi ja sen perustella priorisointi, töiden tiukempi aikataulutus - Yhteistyö liiketoiminnan kanssa hyötyjen hakemisessa	2	4-5	8-10
Lainsäädäntötyö ei tue kehittämistyötä	Osallistutaan itse selvitystyöhön ja autetaan lainsäädäntötyössä. Jatkuva ja tiivis yhteistyö avainkumppaneiden kanssa. RRF juristi (Iida Alen) valittu ja odottaa turselin valmistumista Tarvitaan OM:n puolelta operatiivinen keskustelukumppani DVV:n suuntaan	2	4	8



Hankkeen vaihe ja mieliala

